

Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1		**TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CON SOCIEDAD CIVIL.**	**1 día**	**mar 26/08/2**	**mar 26/08/25**
2		**FASE DE ELABORACIÓN - DIAGNÓSTICO y PROPUESTA**	1 día	mar 26/08/2	mar 26/08/25
3		**TALLERES DE INTEGRACIÓN DE POLITICAS CON LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES - CUSCO**	**106 días?**	**lun 20/10/25**	**lun 16/03/26**
4		Talleres de Socialización y validación del diagnóstico con las 7 municipalidades distritales - Mesas de trabajo con Comités Técnico Ad-Hoc.	8 días?	lun 20/10/25	mié 29/10/25
5		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con la Municipalidad de Wanchaq - Hora 14:30pm	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25
6		Taller de sociliazacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con la Municipalidad de Santiago Hora 14:30pm	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25
7		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con la Municiplaidad de San Sebastian Hora 9:00am	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
8		Taller de sociliazacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con la Municipalidad de San Jeronimo Hora 14:30	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
9		Taller de socializacion de los estudios especilaizados y sintesis de diagnostico con la Municipalidad de Ccorca Hora 10:00am	1 día	mar 21/10/25	mar 21/10/25
10		Taller de socilaizacion de los estudios especializados y sintesis de diagnpostico con la Municipalidad de Poroy Hora 10:00am	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25
11		Taller de socializacion de los estudios especilaizados y sintesis de diagnostico con la Municipalidad de Saylla Hora 10:00am	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25
12		Talleres de Socialización y validación de propuesta general y propuesta específica con las 7 municipalidades distritales - Mesas de trabajo con Comités Técnico Ad-Hoc.	11 días	lun 02/03/26	lun 16/03/26
13		**TALLERES DE INTEGRACIÓN DE POLITICAS CON SOCIEDAD CIVIL - CUSCO**	**78 días?**	**jue 06/11/25**	**lun 23/02/26**
14		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - Wanchaq Hora 17:00	1 día?	jue 06/11/25	jue 06/11/25
15		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - Santiago Hora 17:00	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25
16		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - San Sebastian Hora 17:00	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25
17		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - San Jeronimo Hora 17:00	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25
18		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - Ccorca Hora 9:00	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25
19		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - Poroy Hora 17:00	1 día?	mié 19/11/25	mié 19/11/25
20		Taller de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - Saylla Hora 17:00	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25
21		Talleres de socializacion de los estudios especializados y sintesis de diagnostico con sociedad civil - Cusco Hora 17:00	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25
22		Talleres de socialización y validación de propuesta general y propuesta específica con sociedad civil de los 7 distritos de la provincia del Cusco.	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26
23		Feria informativa por distrito	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25

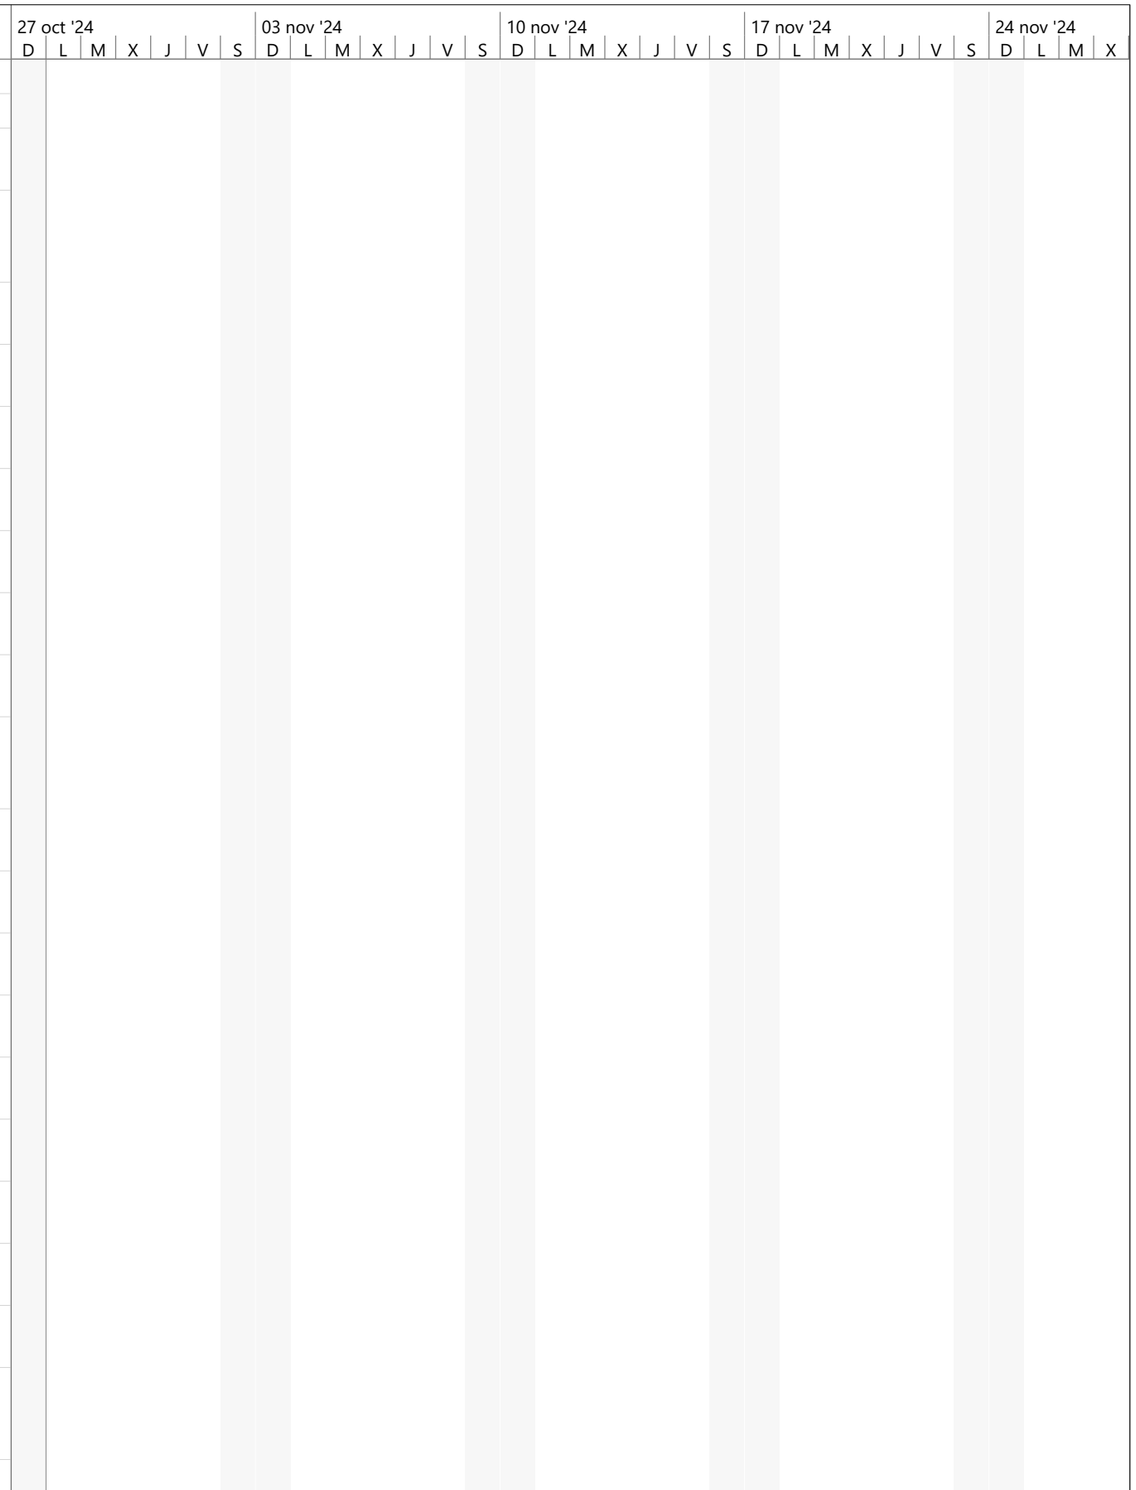

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	


Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin
24		**TALLERES DE INTEGRACION DE POLITICAS A NIVEL REGIONAL - CUSCO**	**103 días**	**jue 30/10/25**	**lun 23/03/26**
25		Talleres de socialización de estudios especializados y síntesis de diagnóstico con dependencias del Gobierno Regional del Cusco y las 7 Gerencias vinculadas	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25
26		Talleres de socialización y validación de propuesta general y propuesta específica con dependecias del Gobierno Regional del Cusco - Mesa de Trabajo	11 días	lun 09/03/26	lun 23/03/26
27		**TALLERES DE INTEGRACION DE POLITICAS A NIVEL SECTORIAL - CUSCO**	**7 días**	**lun 27/10/25**	**mar 04/11/25**
28		Mesas de trabajo multidisciplinarisocialización de estudios especializados y síntesis de diagnóstico y construcciónde propuesta general con miembros de la Comisión Técnica Especializada permanente.	1 día	mar 04/11/25	mar 04/11/25
29		Trabajo con Mesas de trabajo multidisciplinaria	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25
30					
31		**IMPLEMENTACION DE LA MESA DE CIUDADANIA DE ASUNTOS URBANOS Y GESTION TERRITORIAL - CUSCO**	**102 días**	**vie 03/10/25**	**lun 23/02/26**
32		Programa de Capacitación a miembros de la Mesa Ciudadana y desarrollo de Mesa de Trabajo para identificación de Problemática Urbana	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25
33		Conformación de Mesas ciudadana provincial ern coordinación con las oficinas de participación ciudadana de las municipalidades distritales -	11 días	vie 03/10/25	vie 17/10/25
34		Programa de capacitación a miembros de la Mesa ciudadana y desarrollo de Mesa de Trabajo para identificación de problemática urbana.	11 días	lun 03/11/25	lun 17/11/25
35		Mesa de trabajo la Mesa Ciudadana para generación de propuesta de politica pública urbana.	16 días	lun 02/02/26	lun 23/02/26
36		**AGENDA URBANA Y POLITICAS PUBLICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA COMISION TECNICA ESPECIALIZADA PERMANENTE - CUSCO**	**10 días**	**mar 09/12/25**	**lun 22/12/25**
37		Elaboración de la Agenda Urbana con la participación de la Mesa ciudadana y la Comisión Técnica Especializada.	10 días	mar 09/12/25	lun 22/12/25
38		**DIFUSION Y COMUNICACION DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA.**	1 día	mar 26/08/25	mar 26/08/25
39		GENERACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	70 días	lun 15/09/25	vie 19/12/25
40		Difusión radial	5 días	lun 20/10/25	vie 24/10/25
41		Difusión televisiva	15 días	lun 28/10/24	vie 15/11/24
42		Difusión por medios escritos	15 días	lun 17/11/25	vie 05/12/25
43		**ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS.**	**91 días**	**lun 03/11/25**	**lun 09/03/26**
44		Etapa de diagnóstico.	11 días	lun 03/11/25	lun 17/11/25
45		Etapa de propuesta	11 días	lun 23/02/26	lun 09/03/26
46					
47					

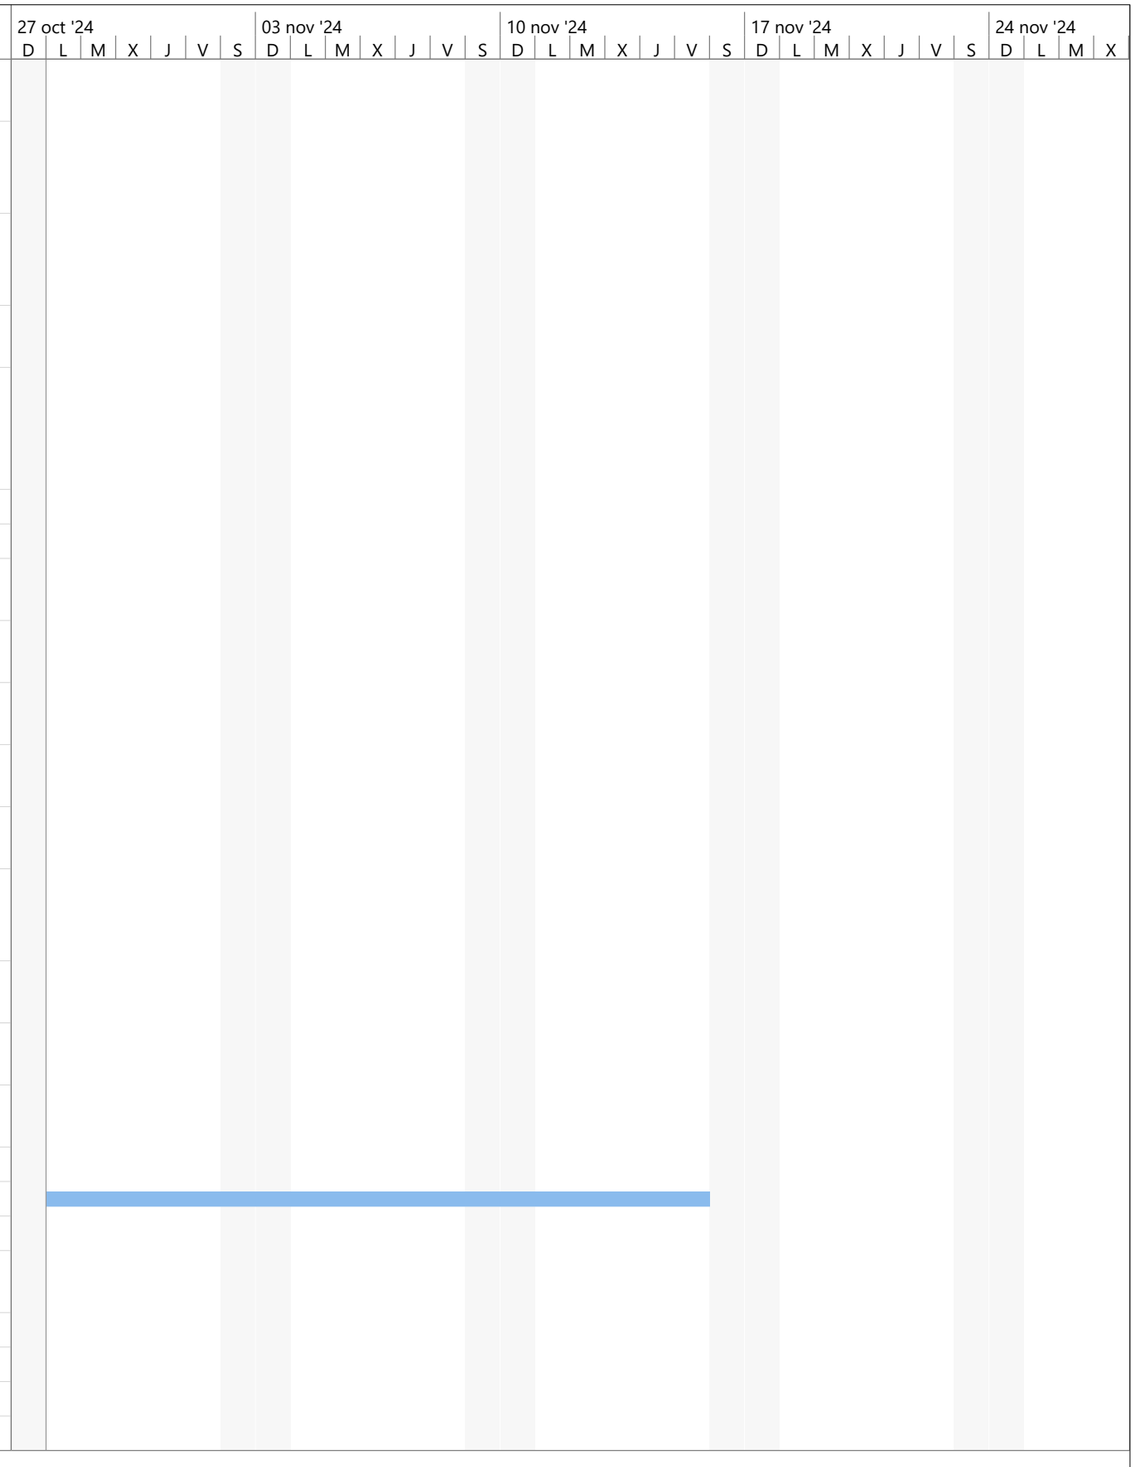

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin
48		3.2.1.6.TALLER DE LANZAMIENTO FINAL DE RESULTADOS DE MÓDULO DE GESTIÓN TERRITORIAL - CUSCO	22 días	lun 02/03/26	mar 31/03/26




Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

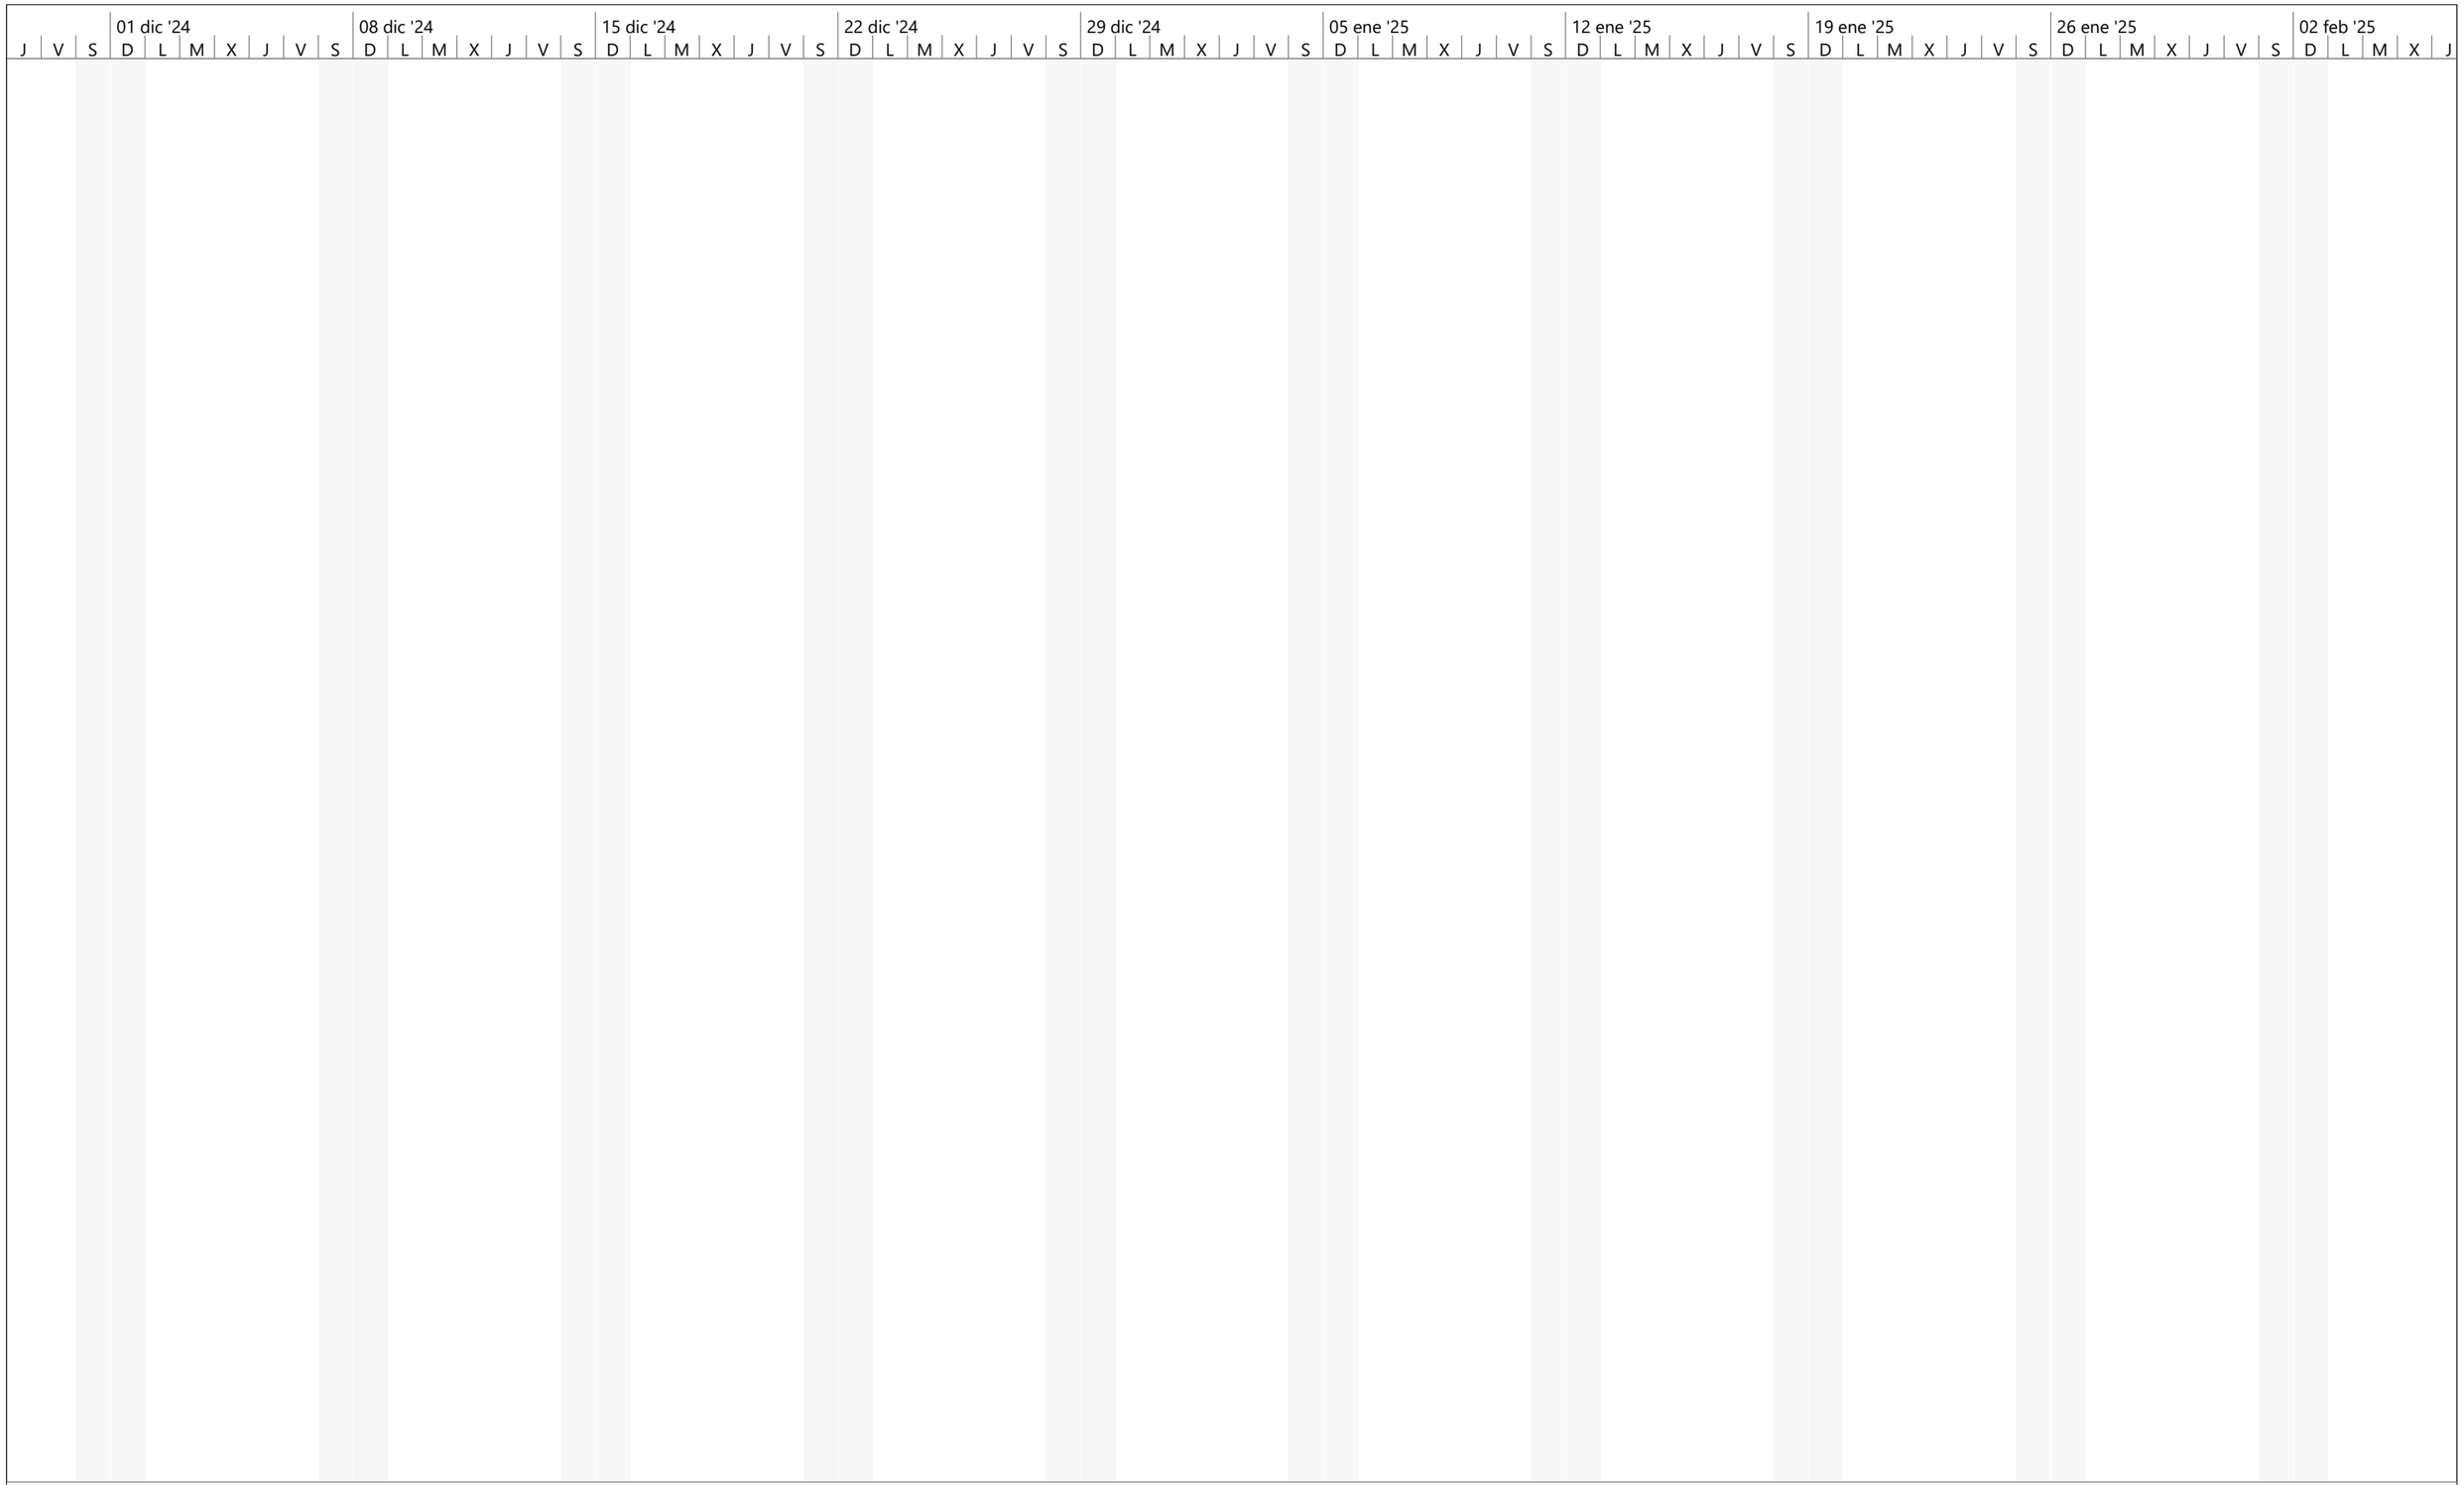

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

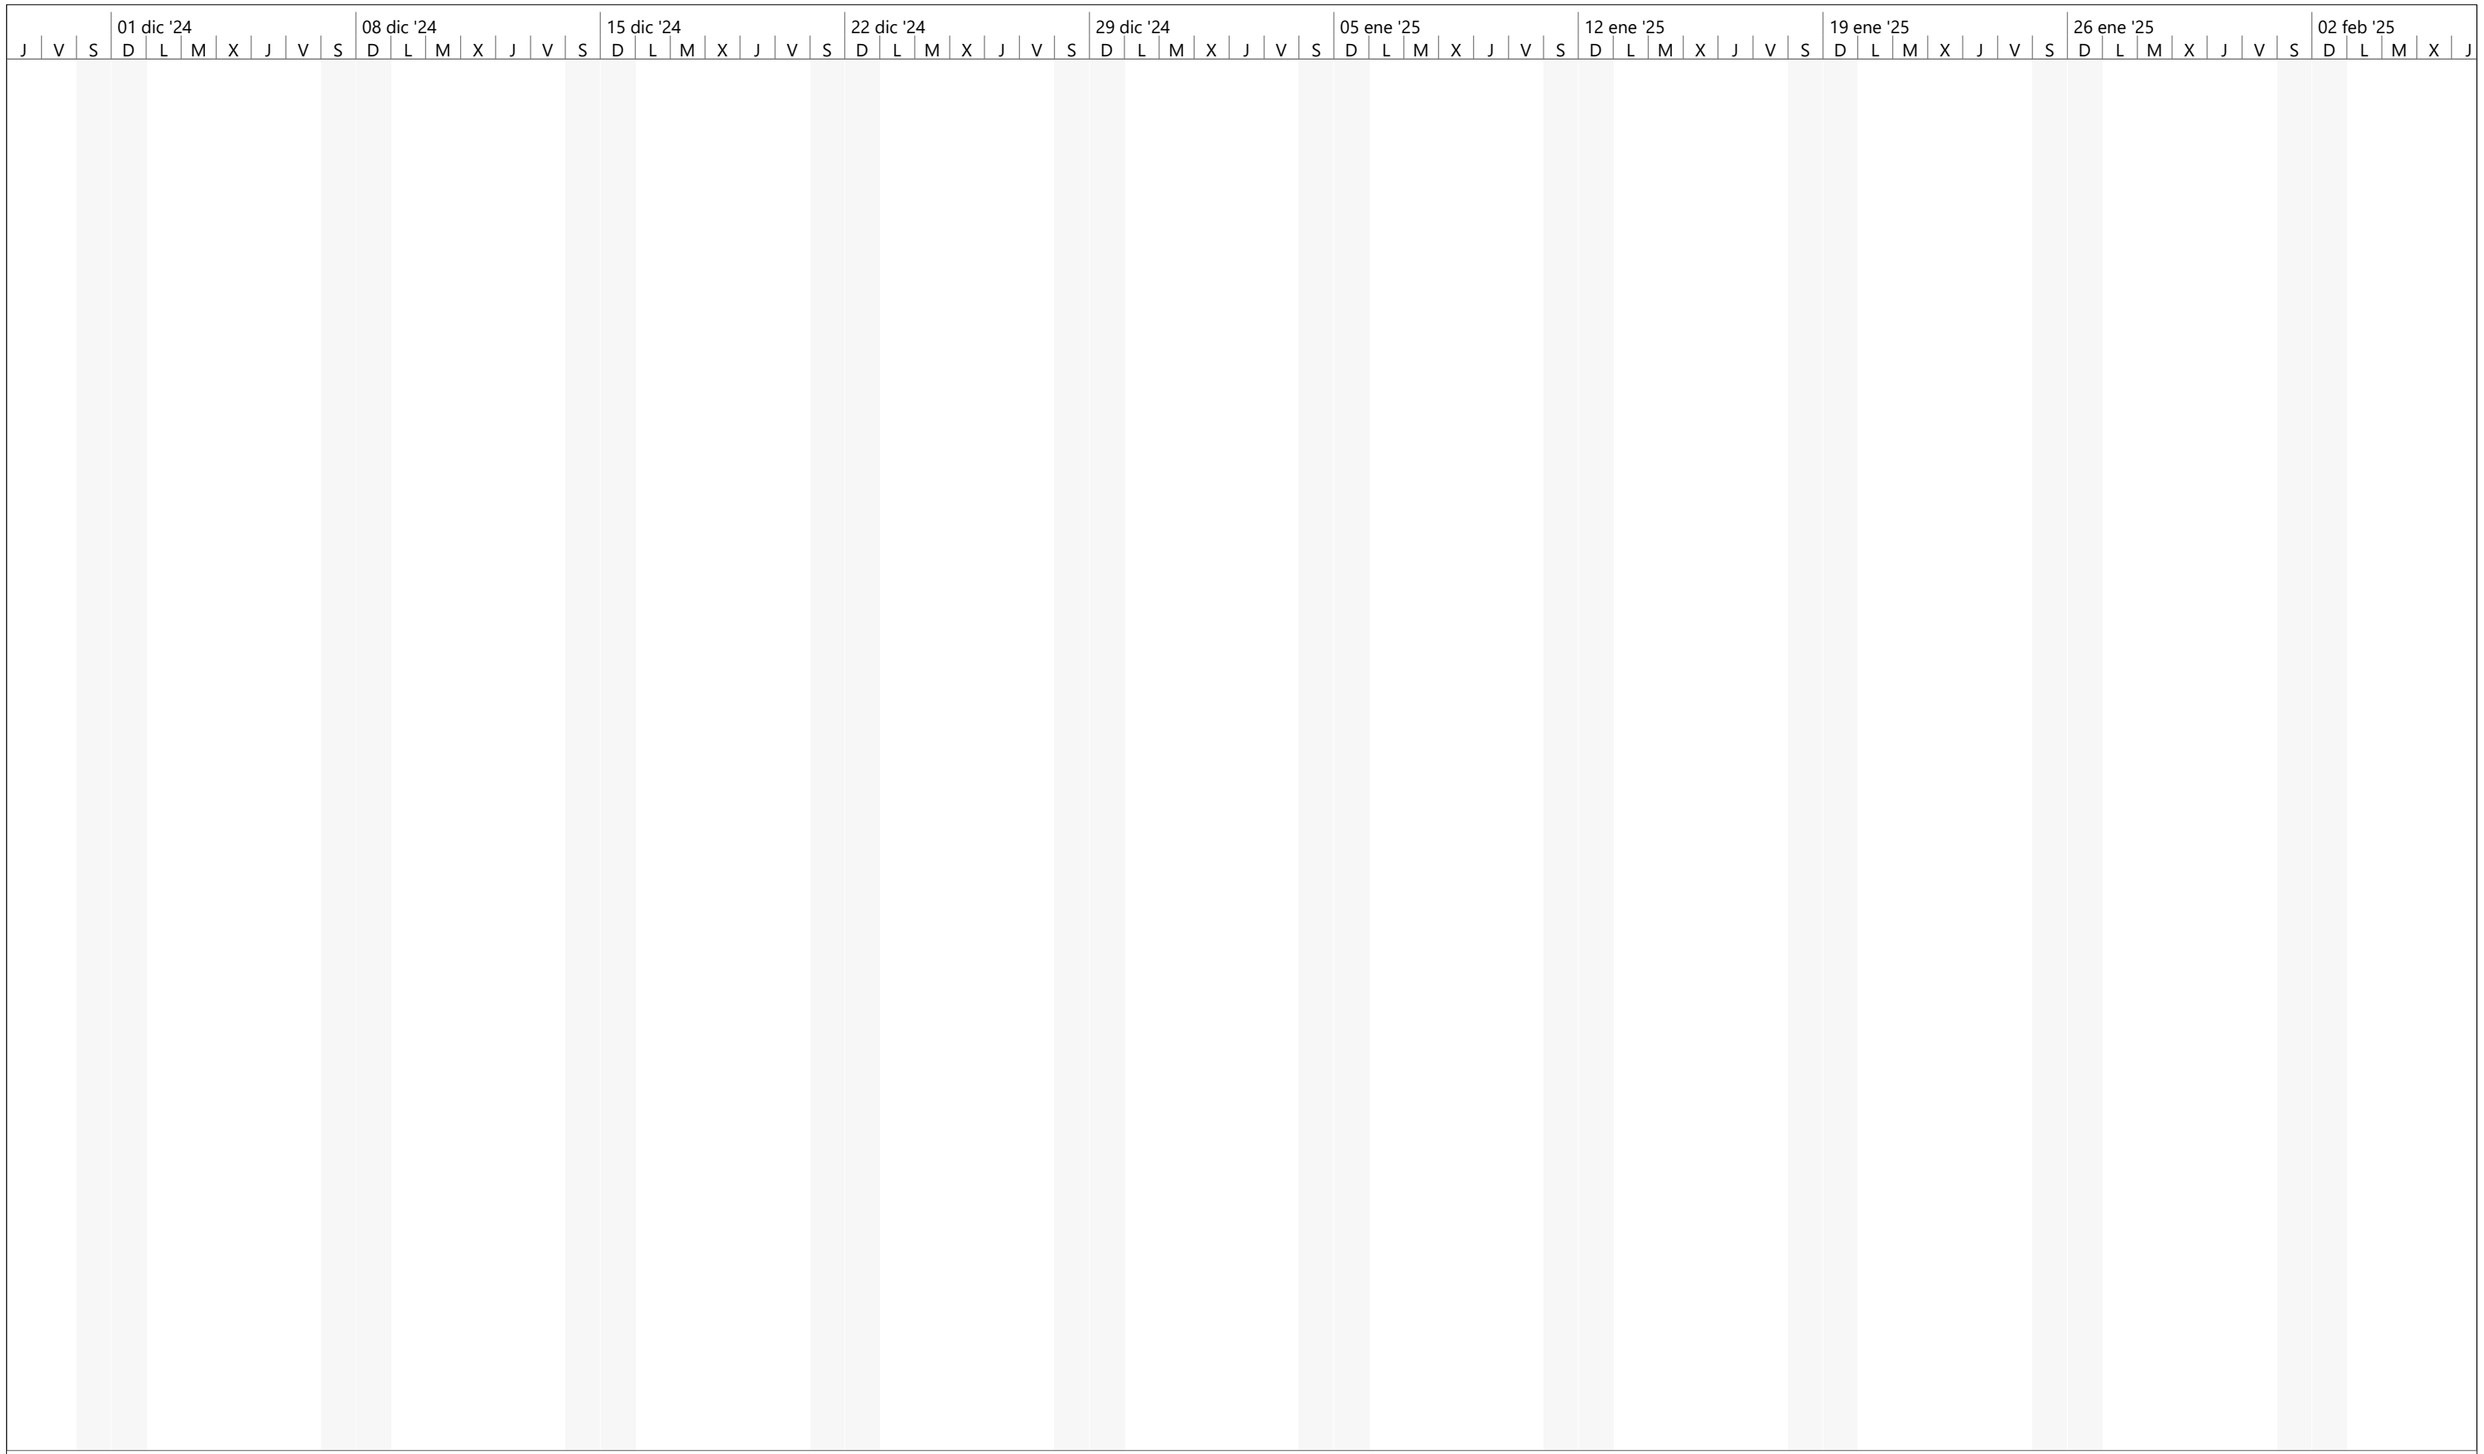


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone



Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

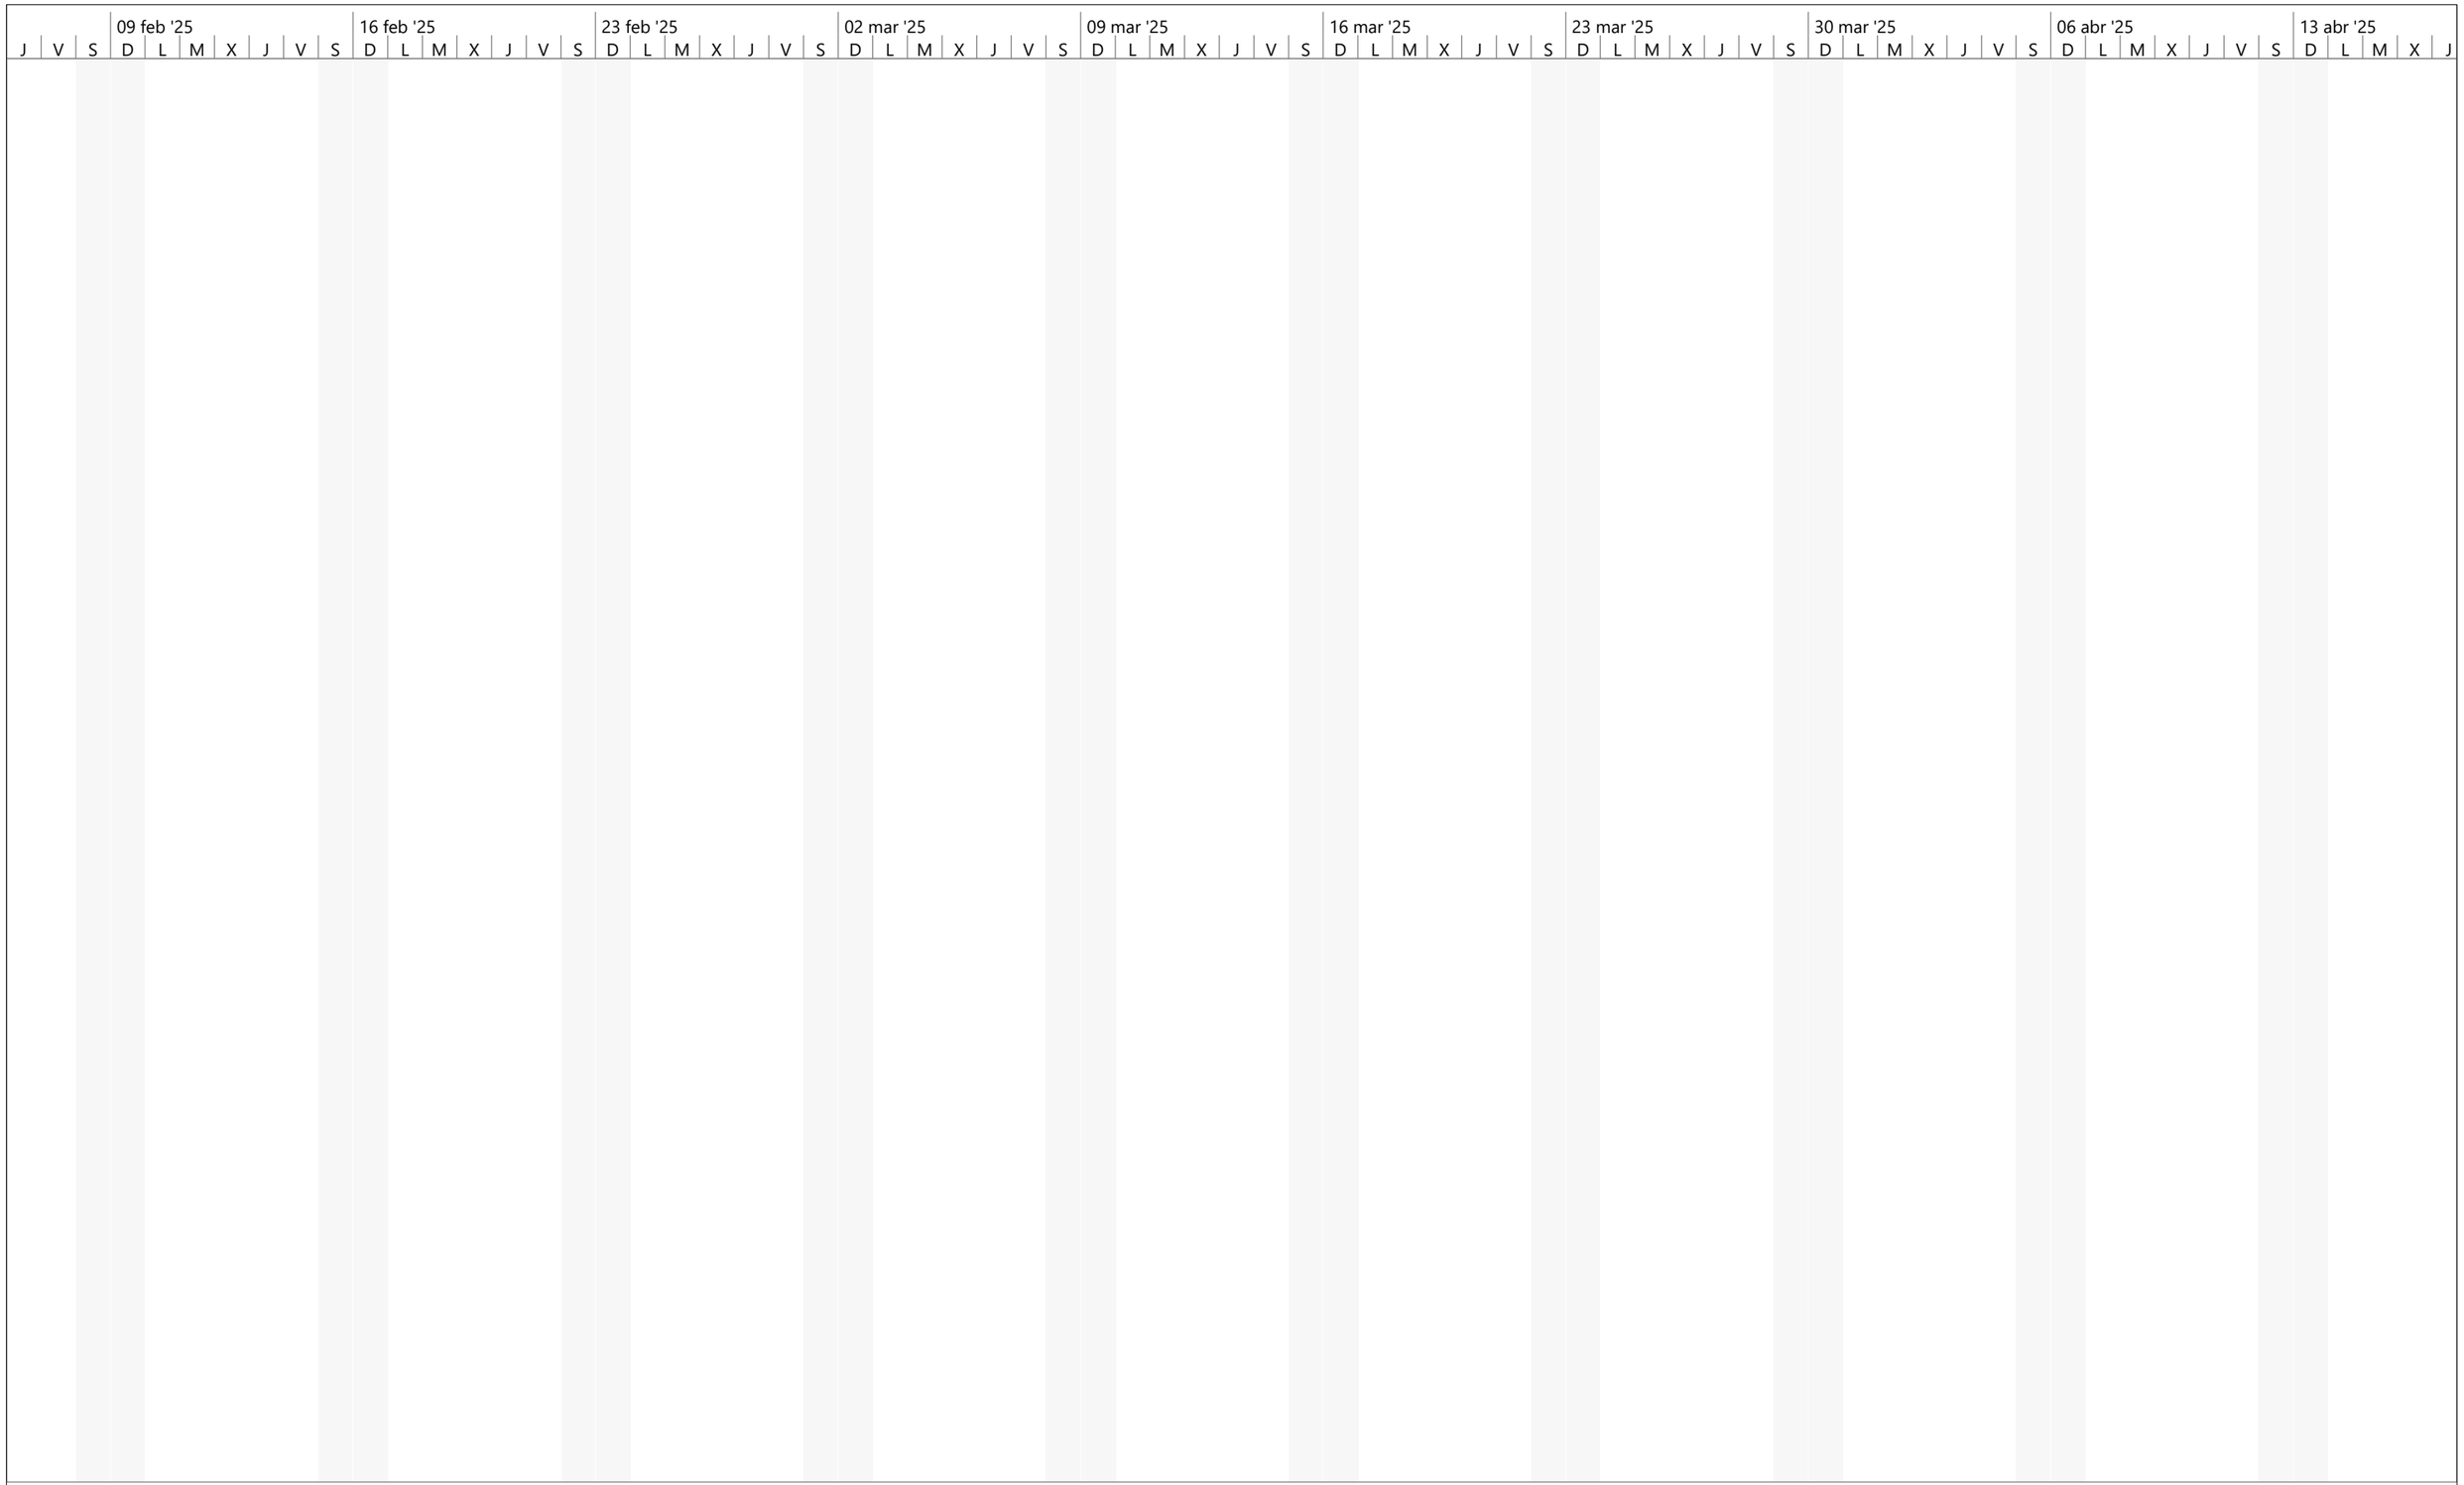

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone




Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone




Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

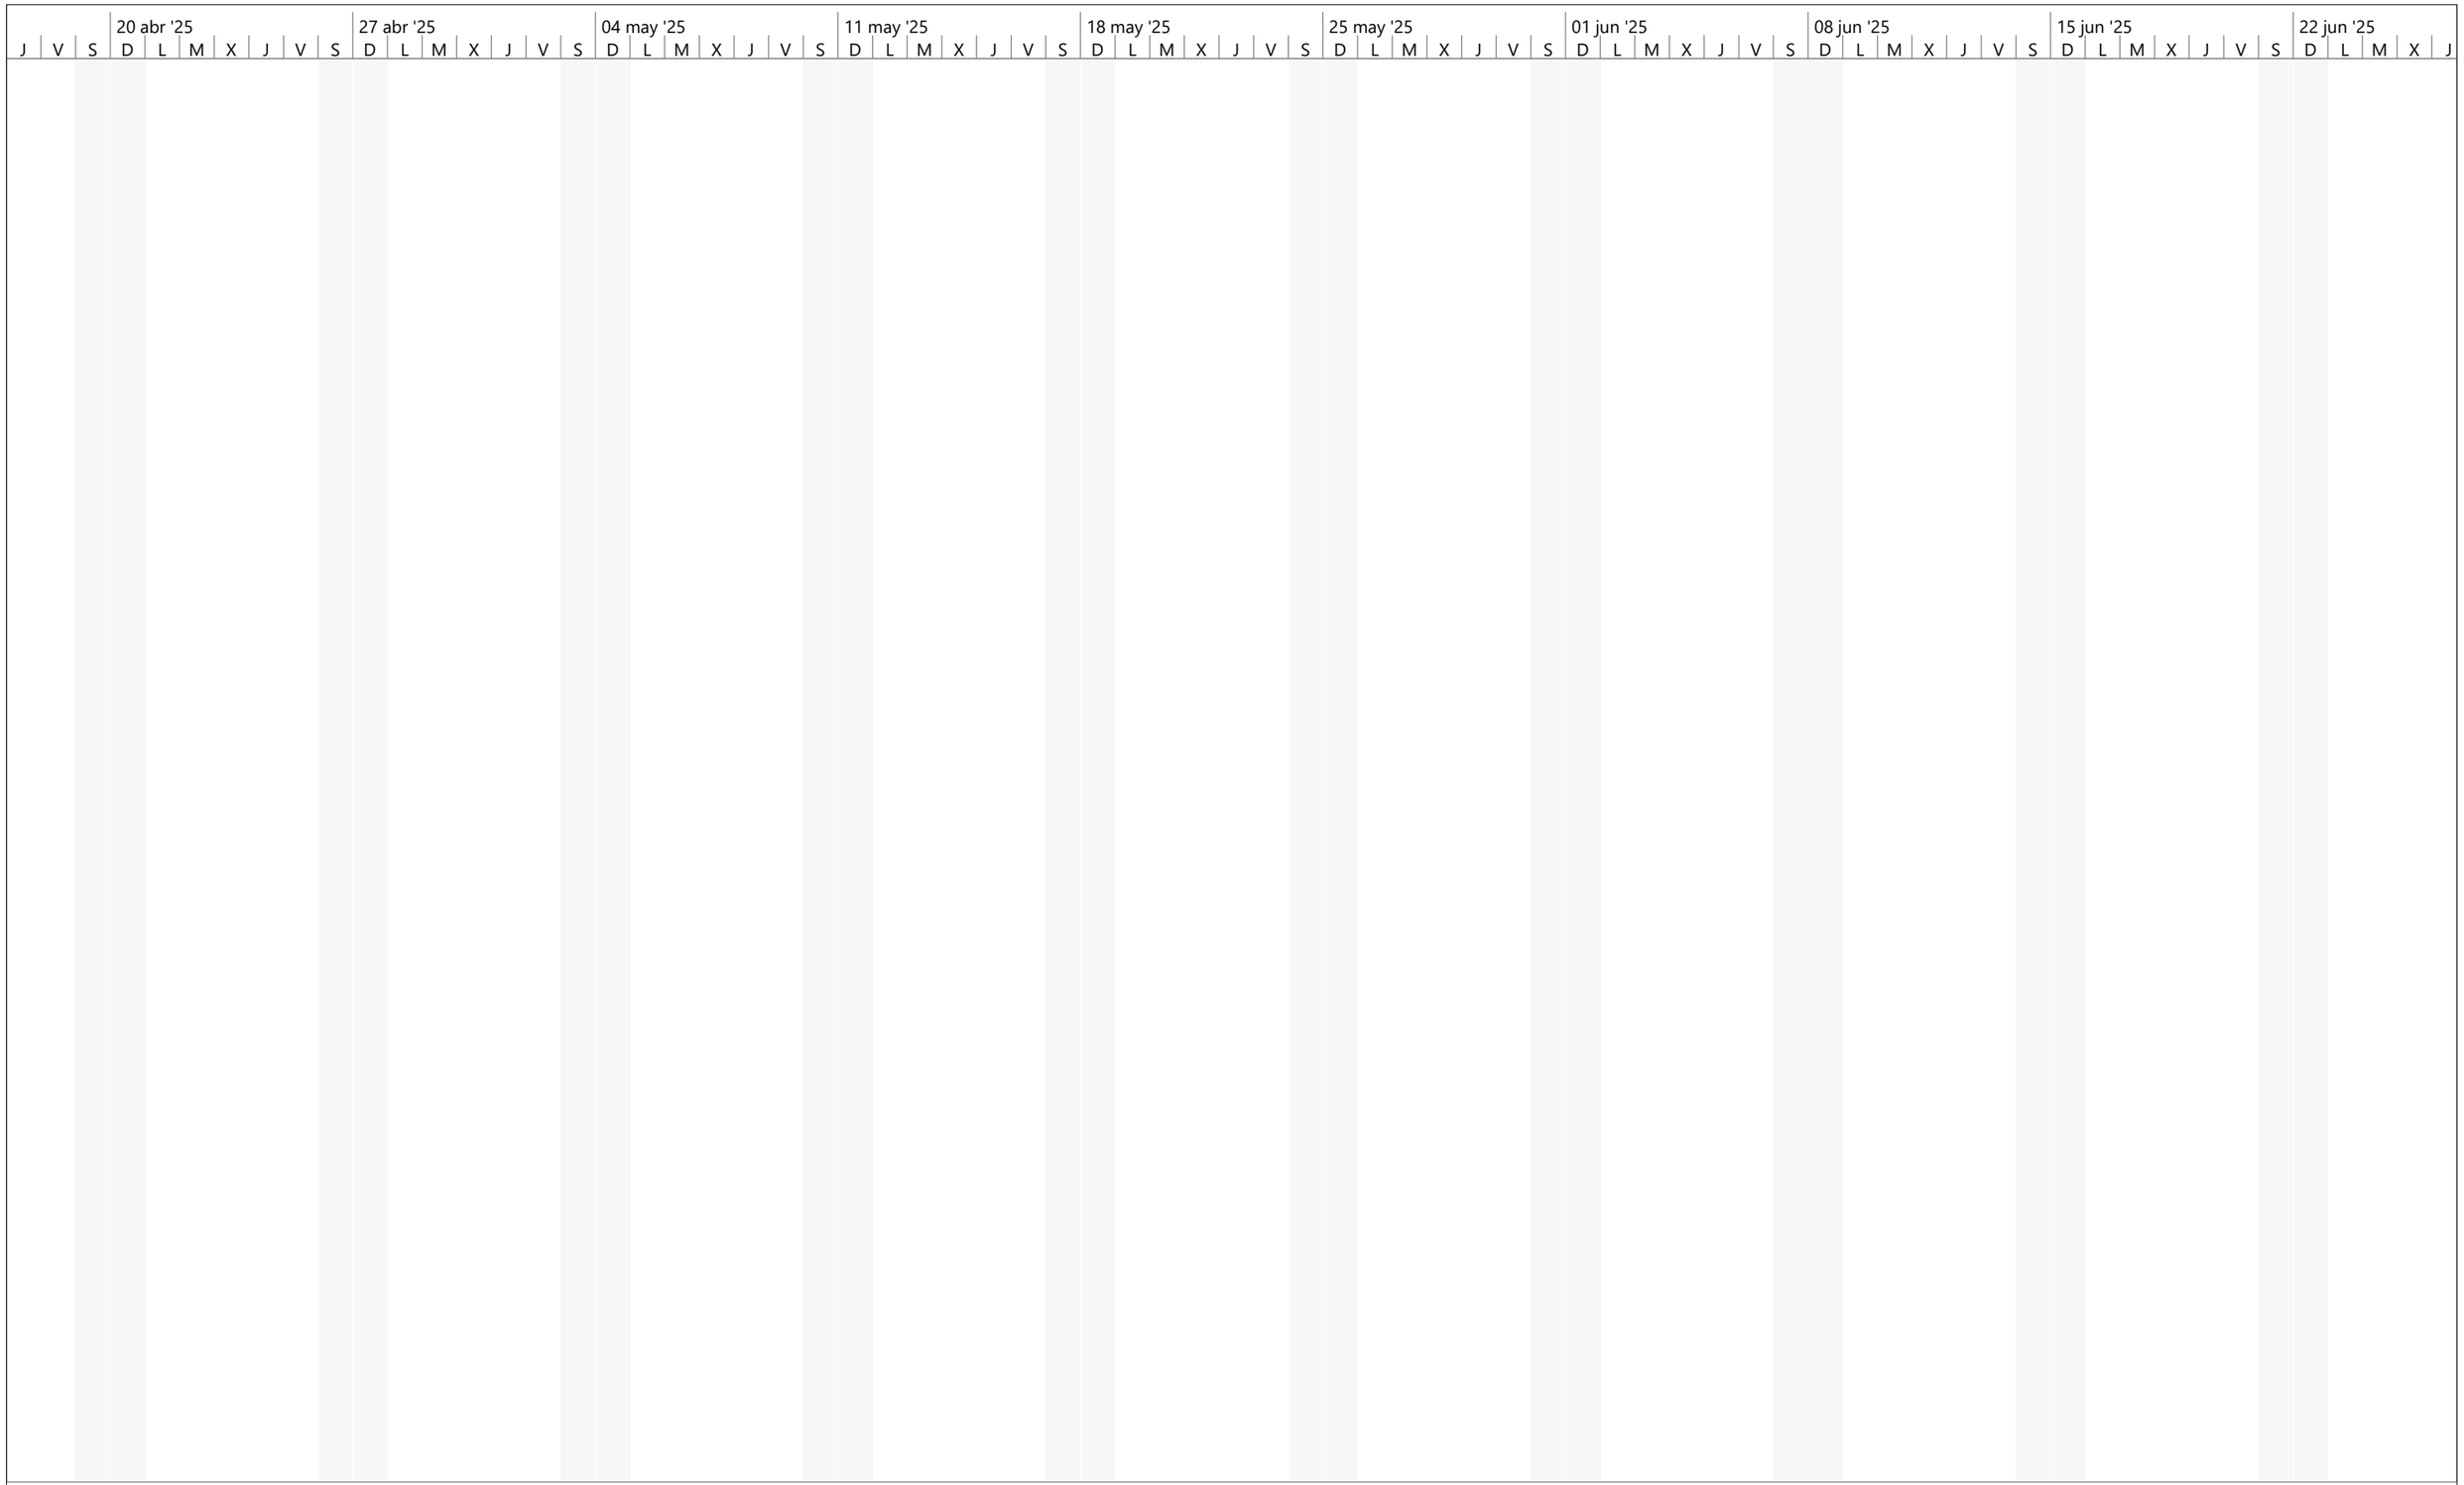


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

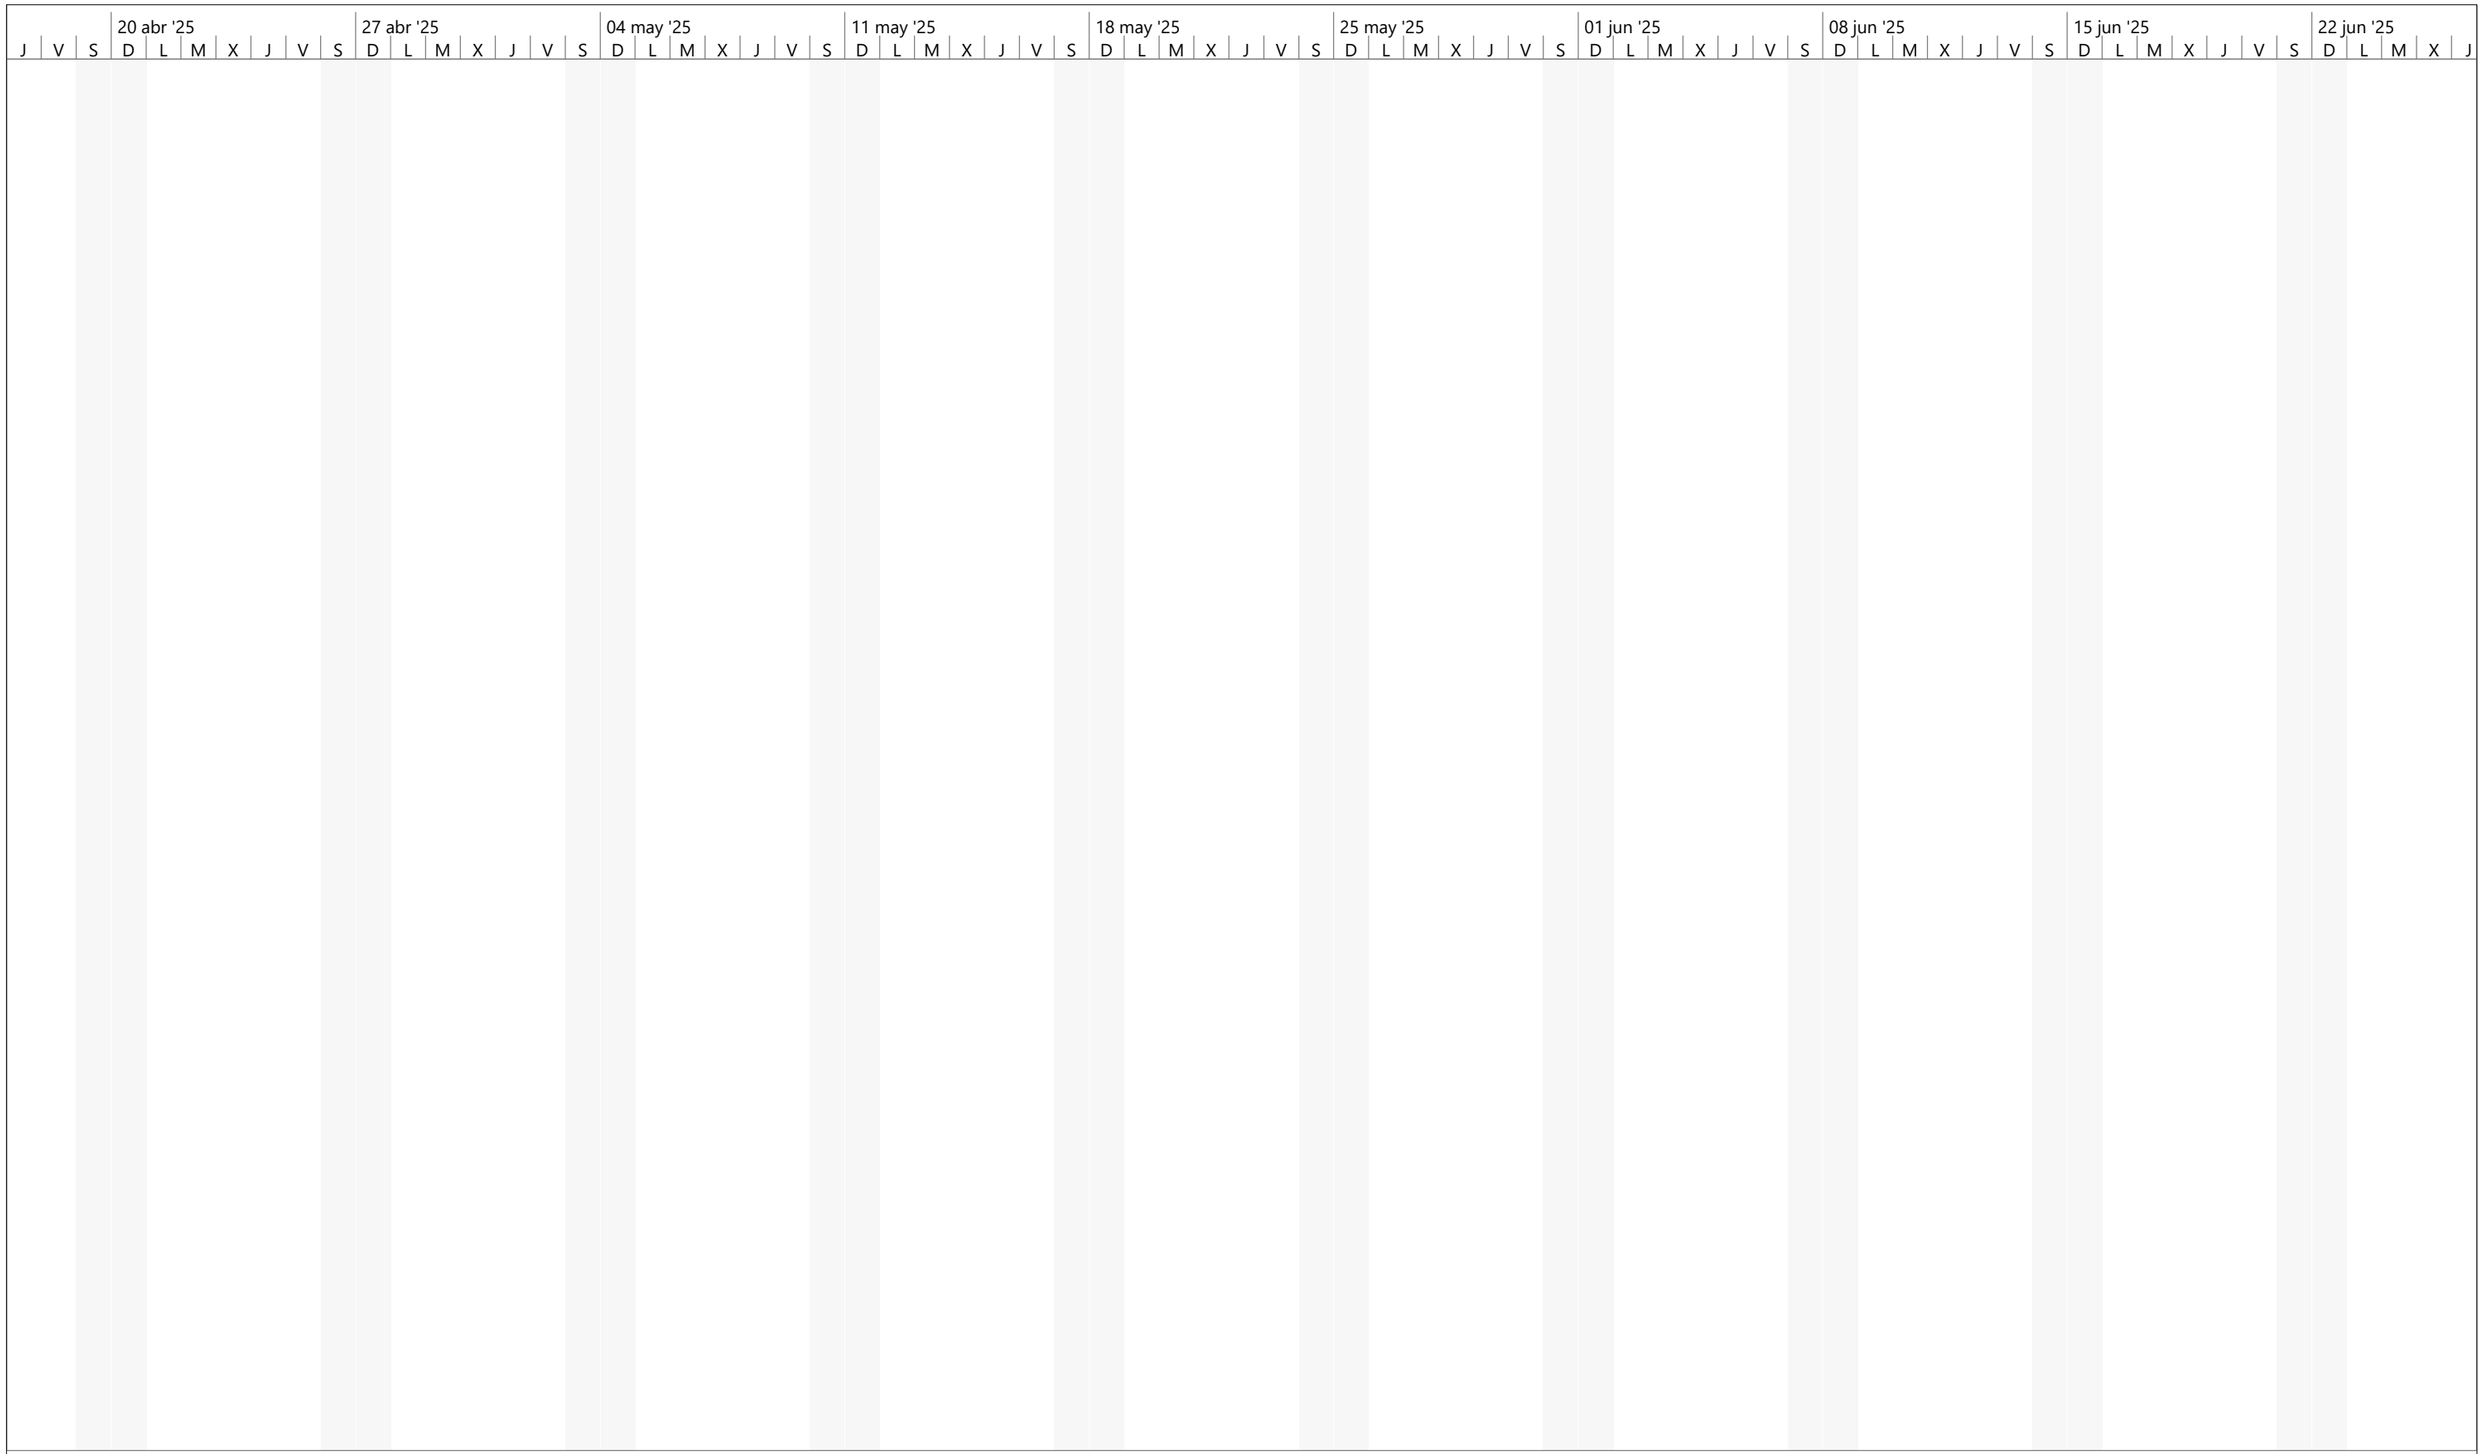


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

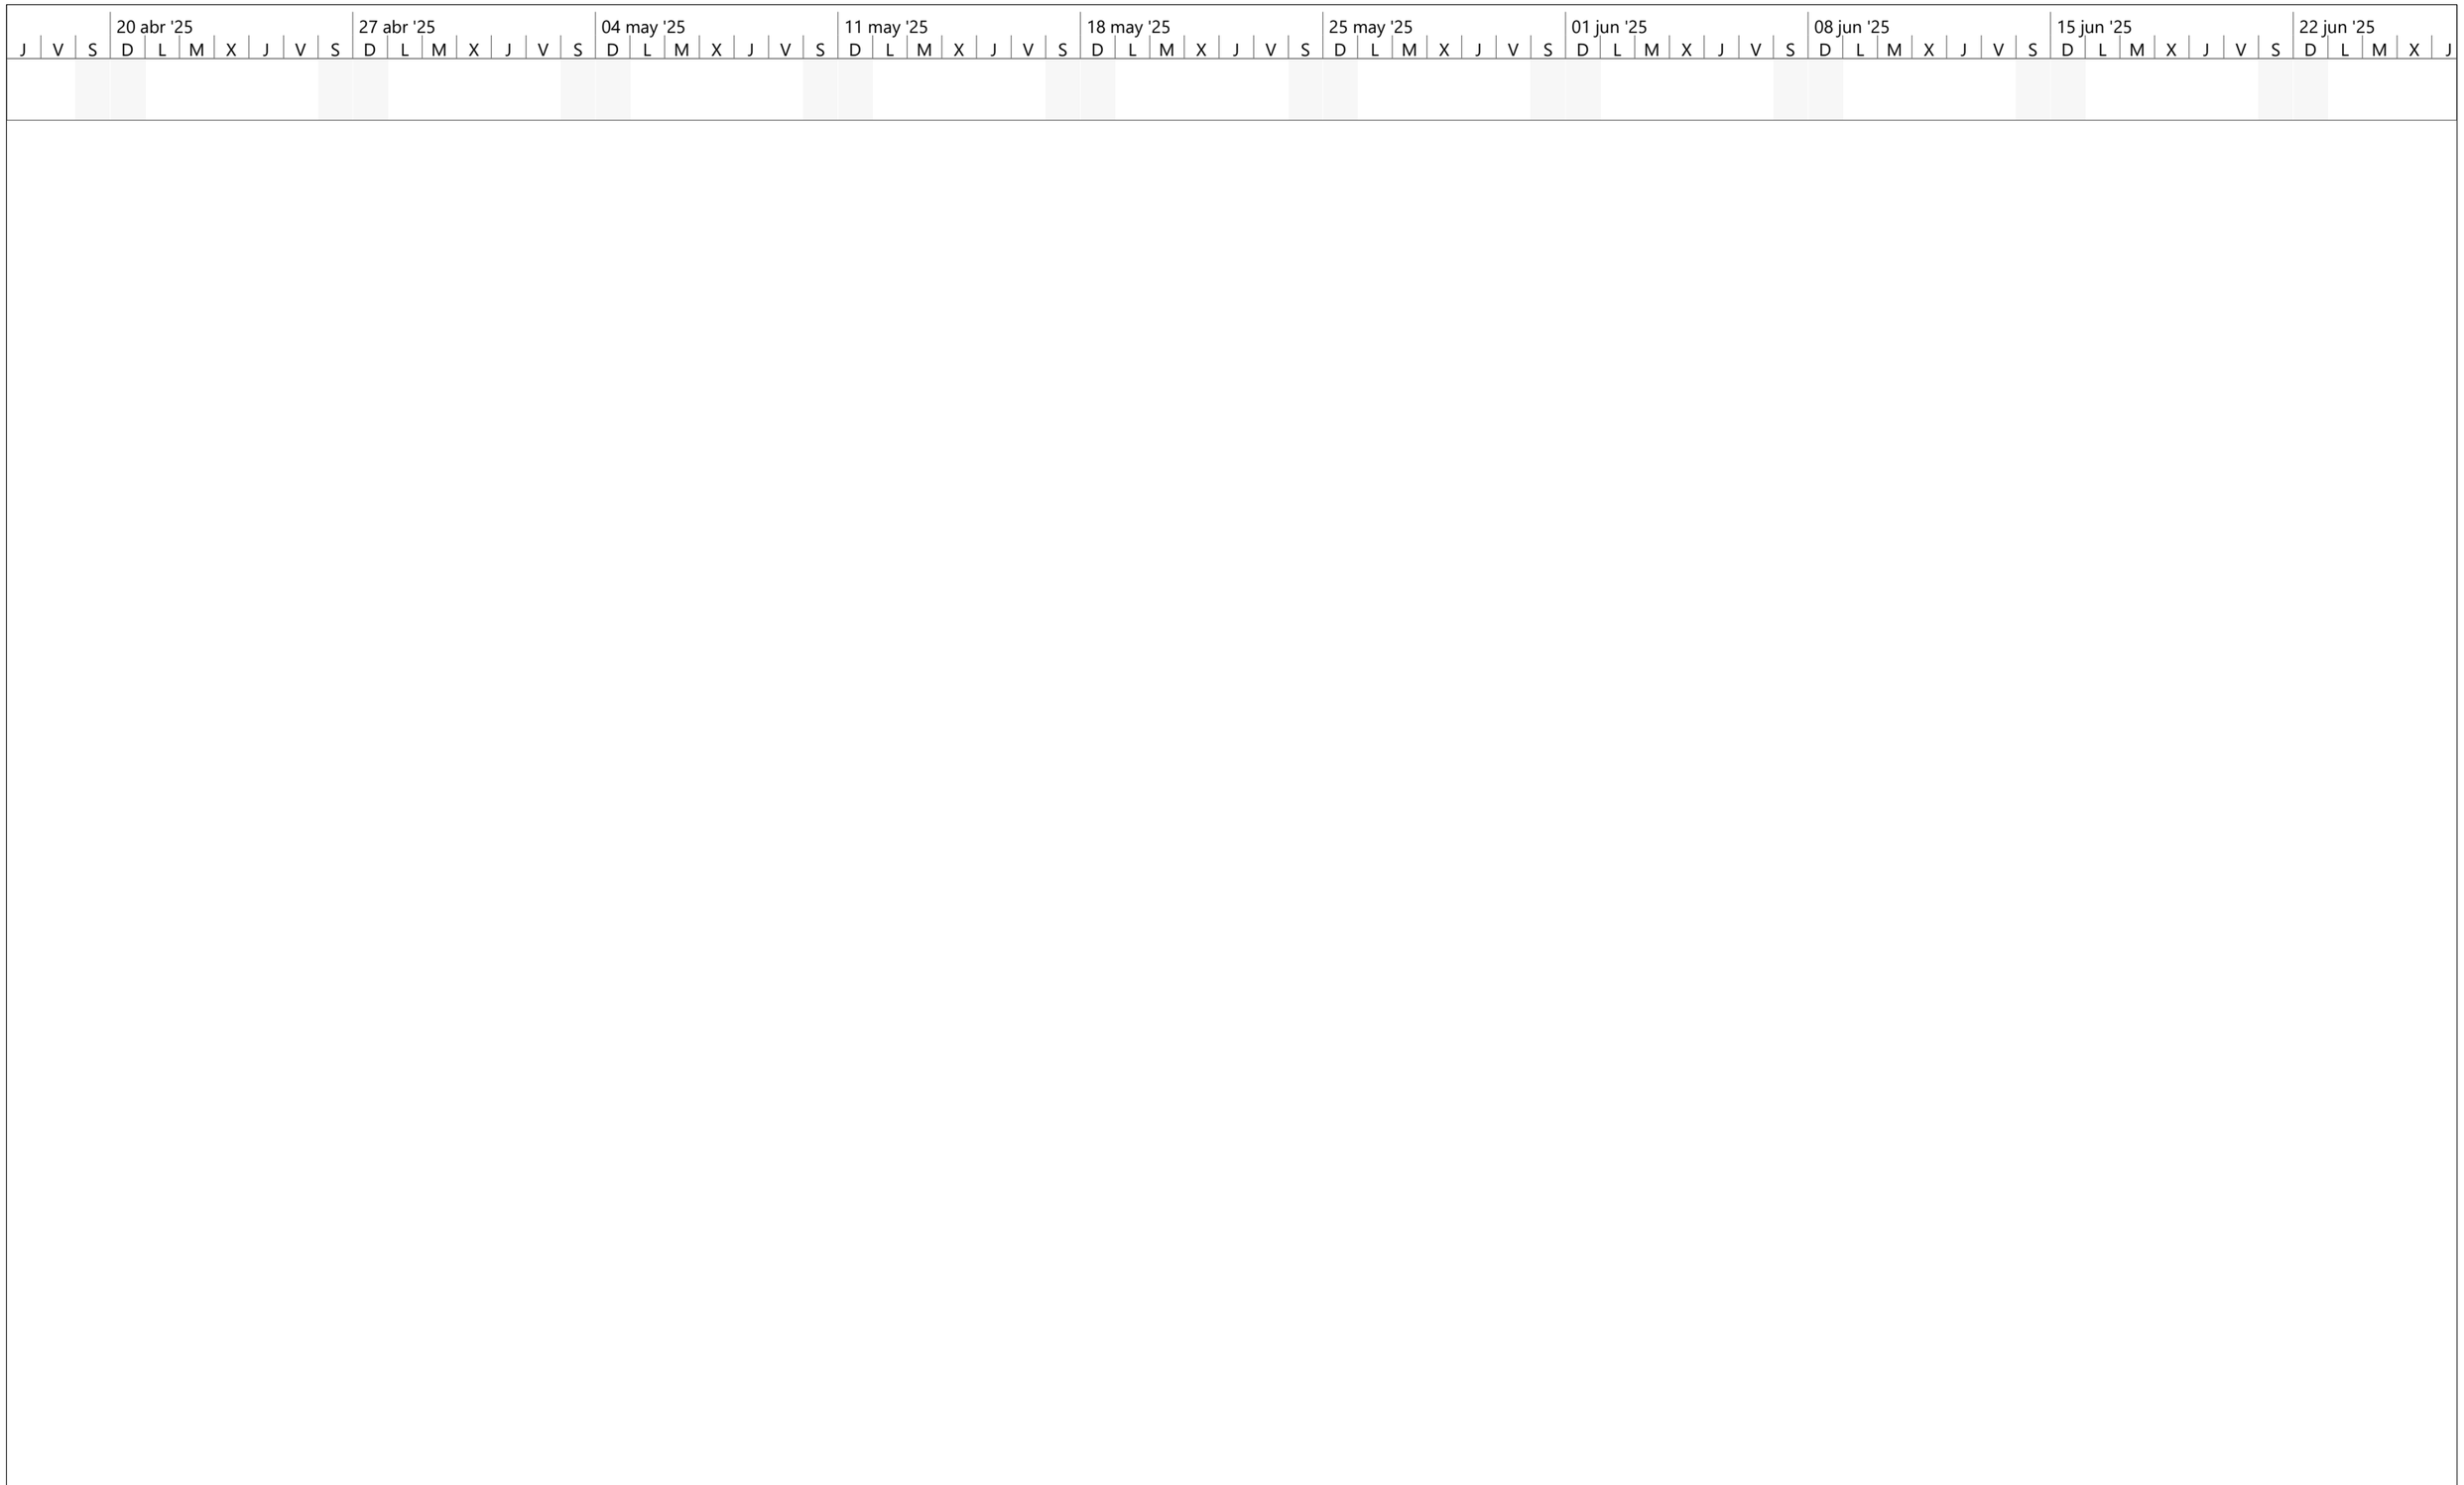




Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

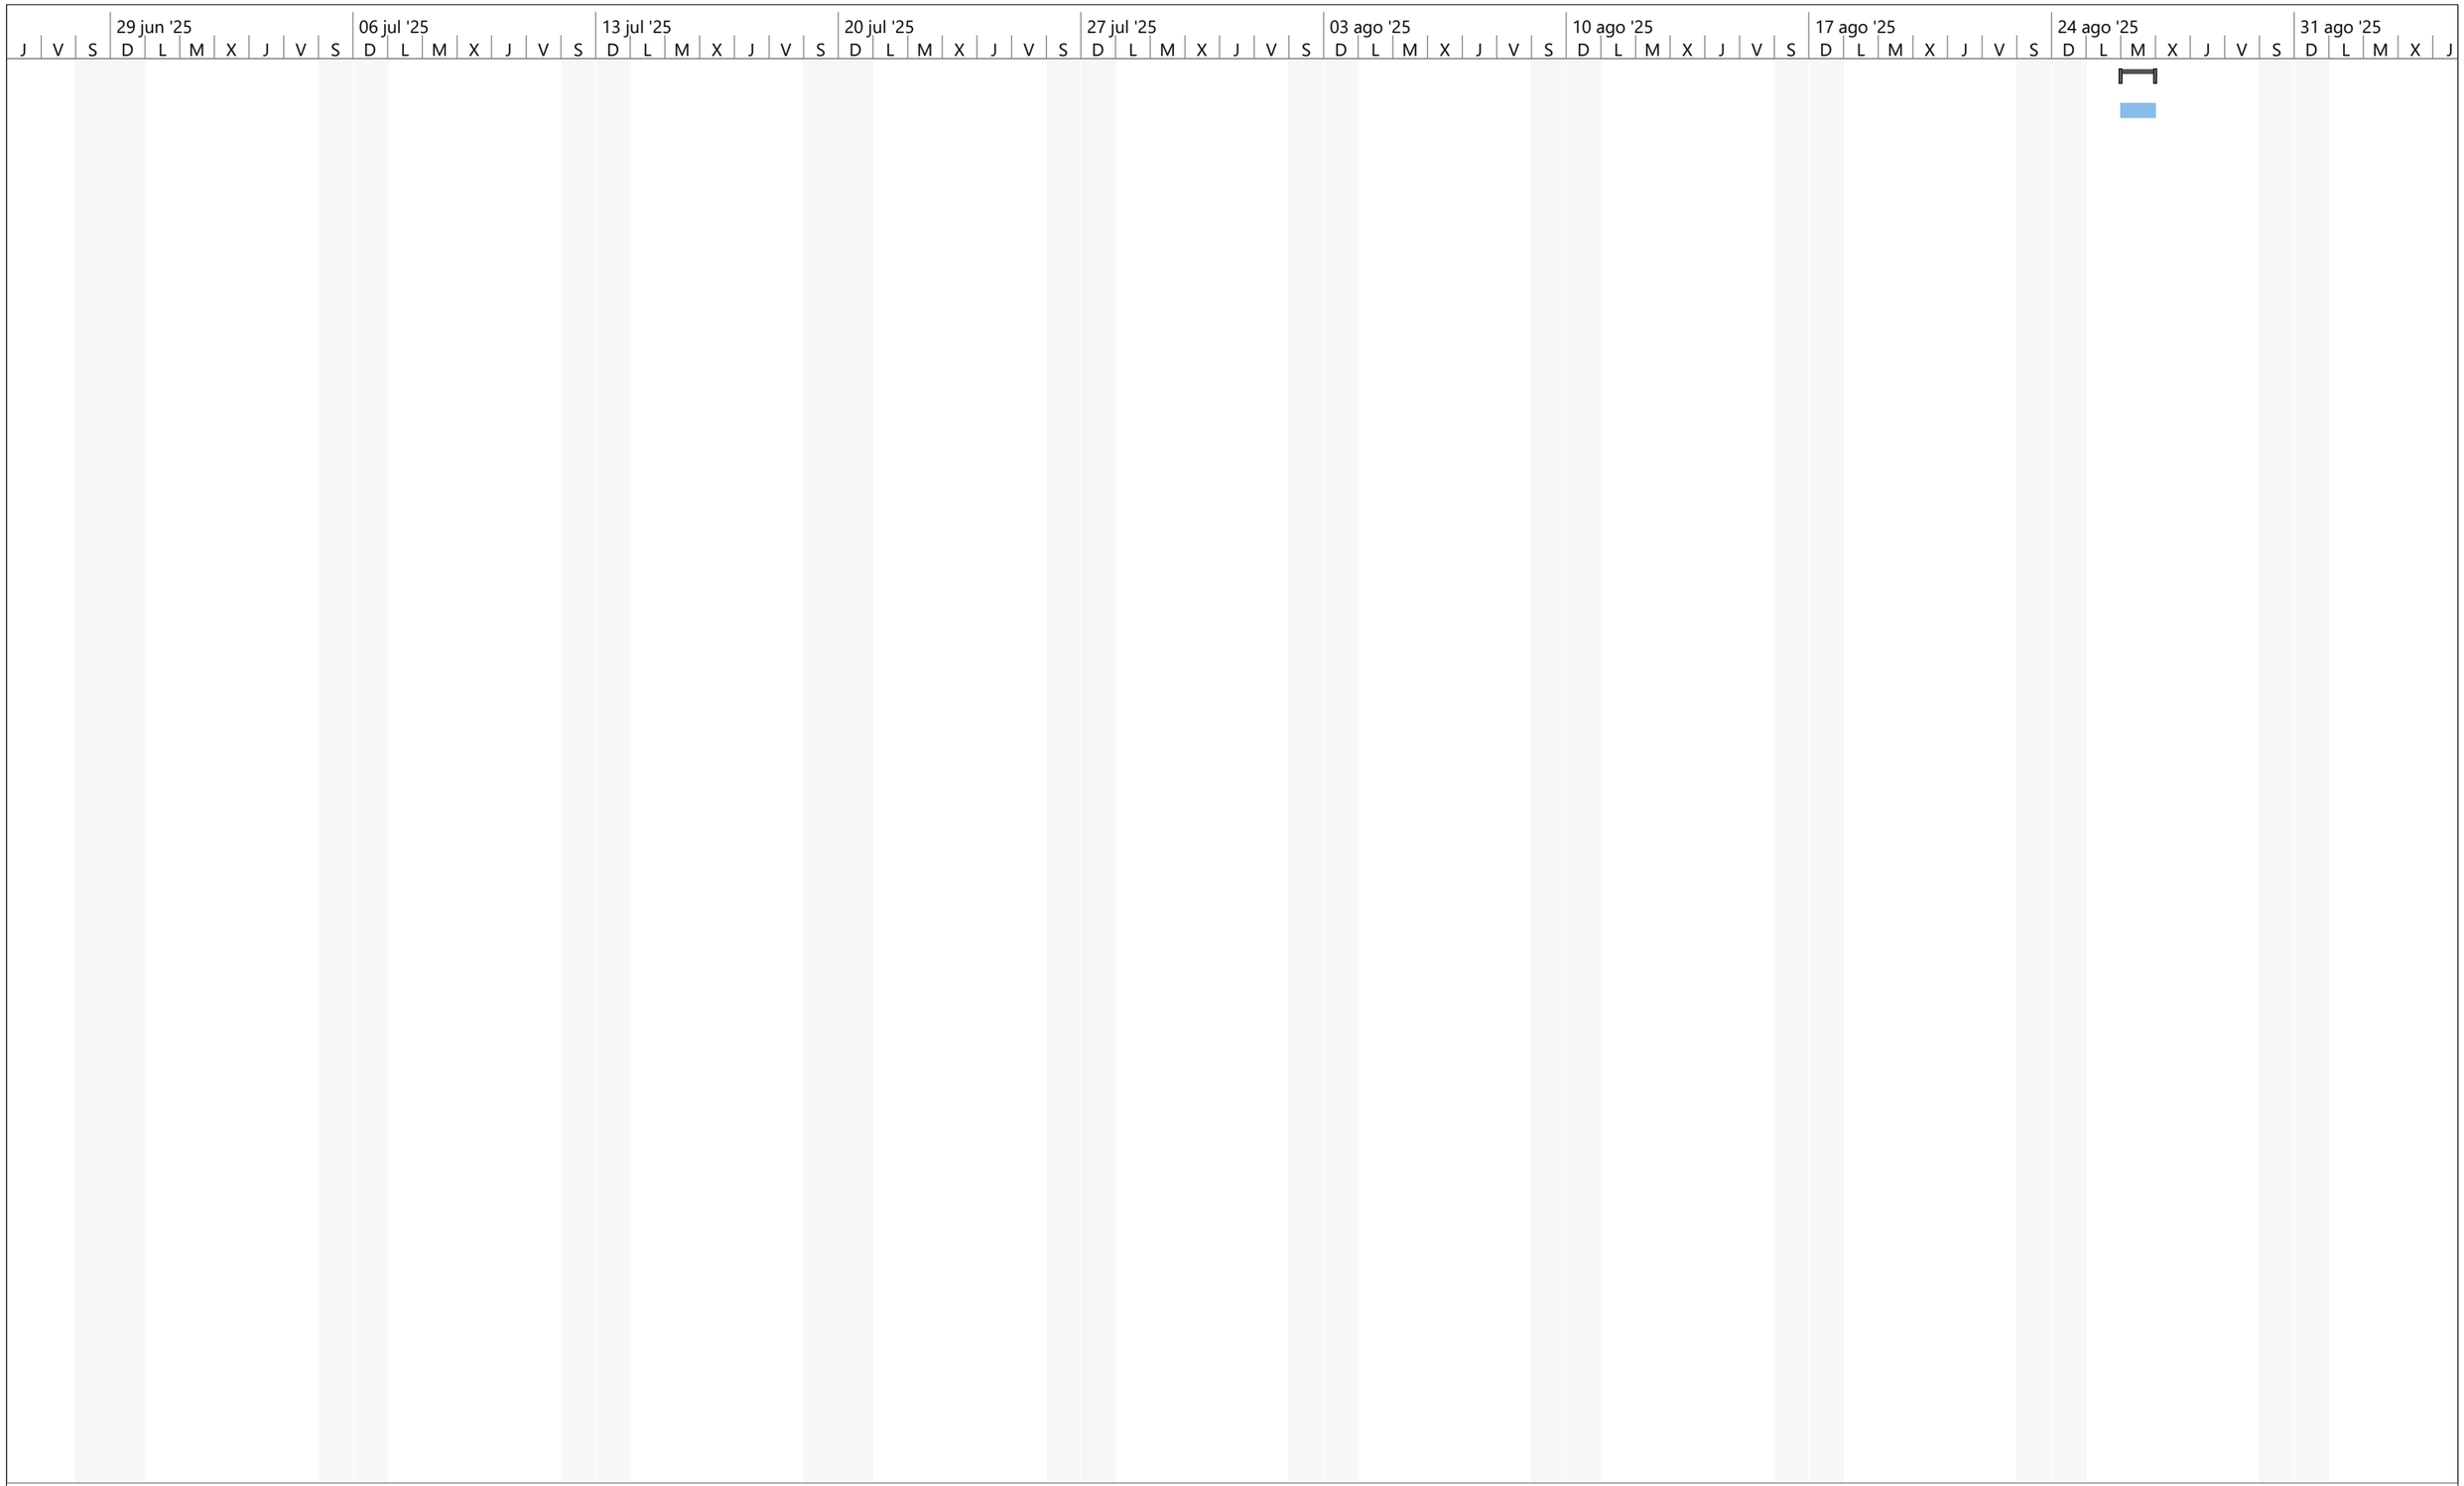


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

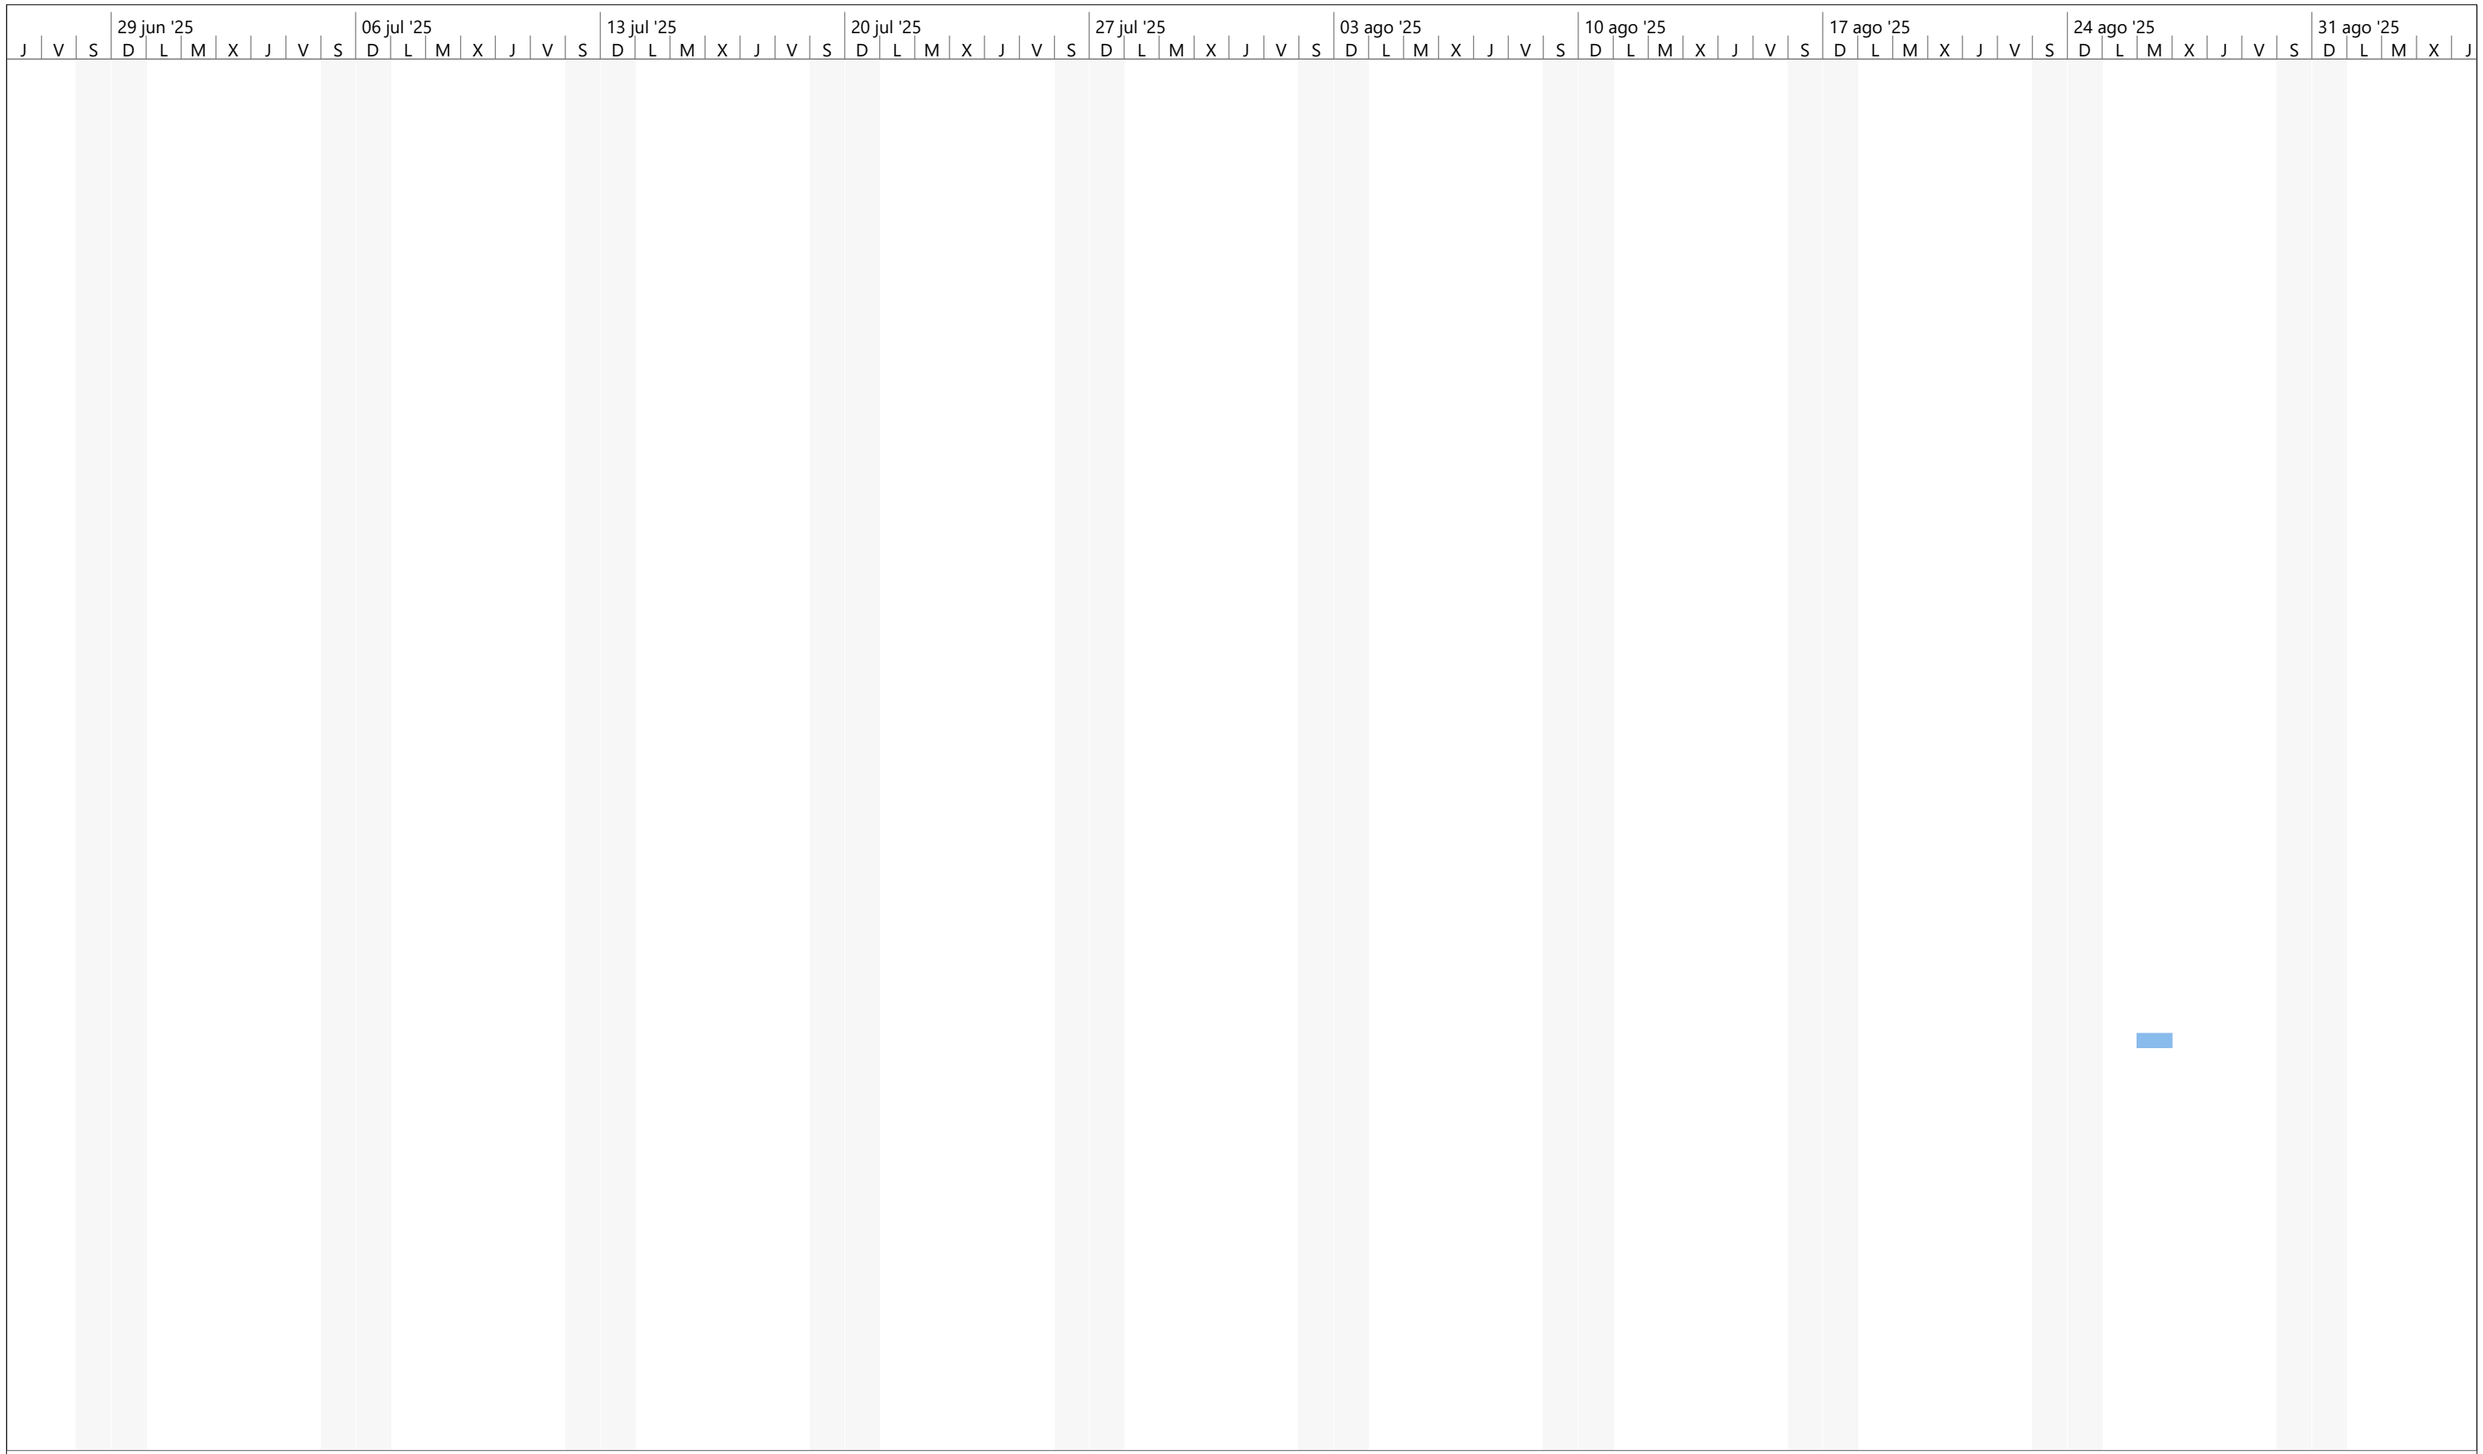


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

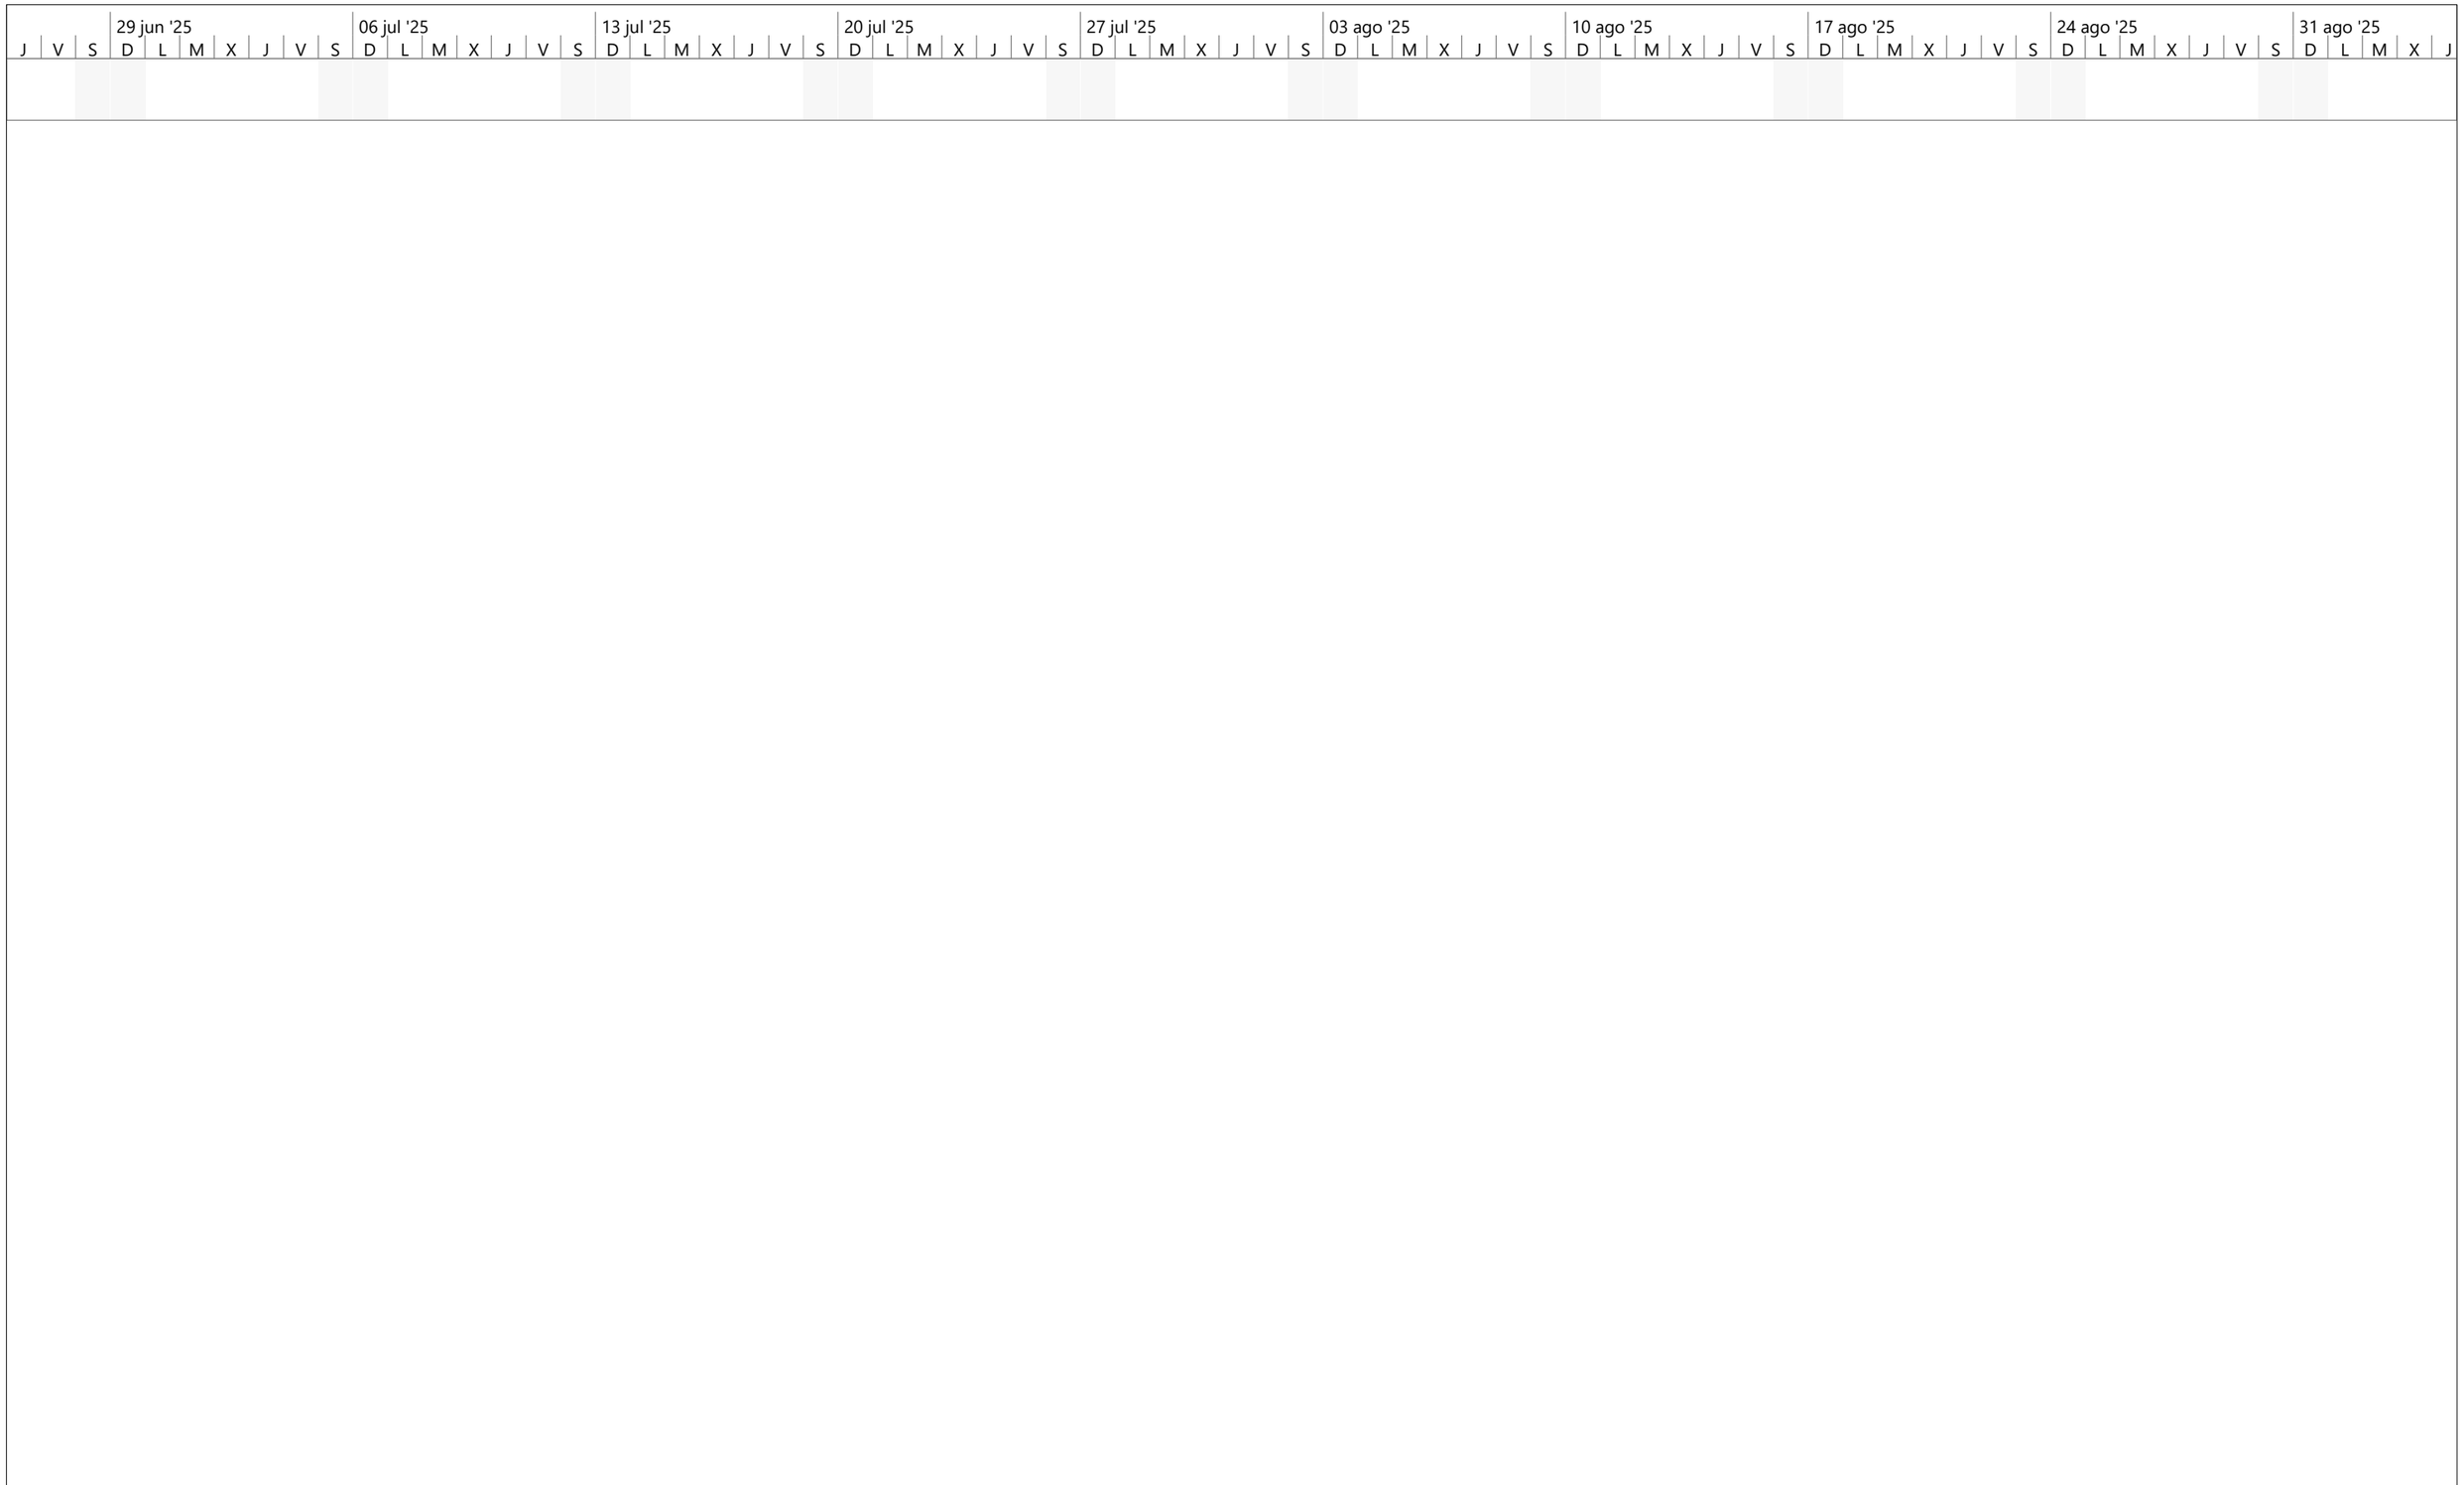




Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

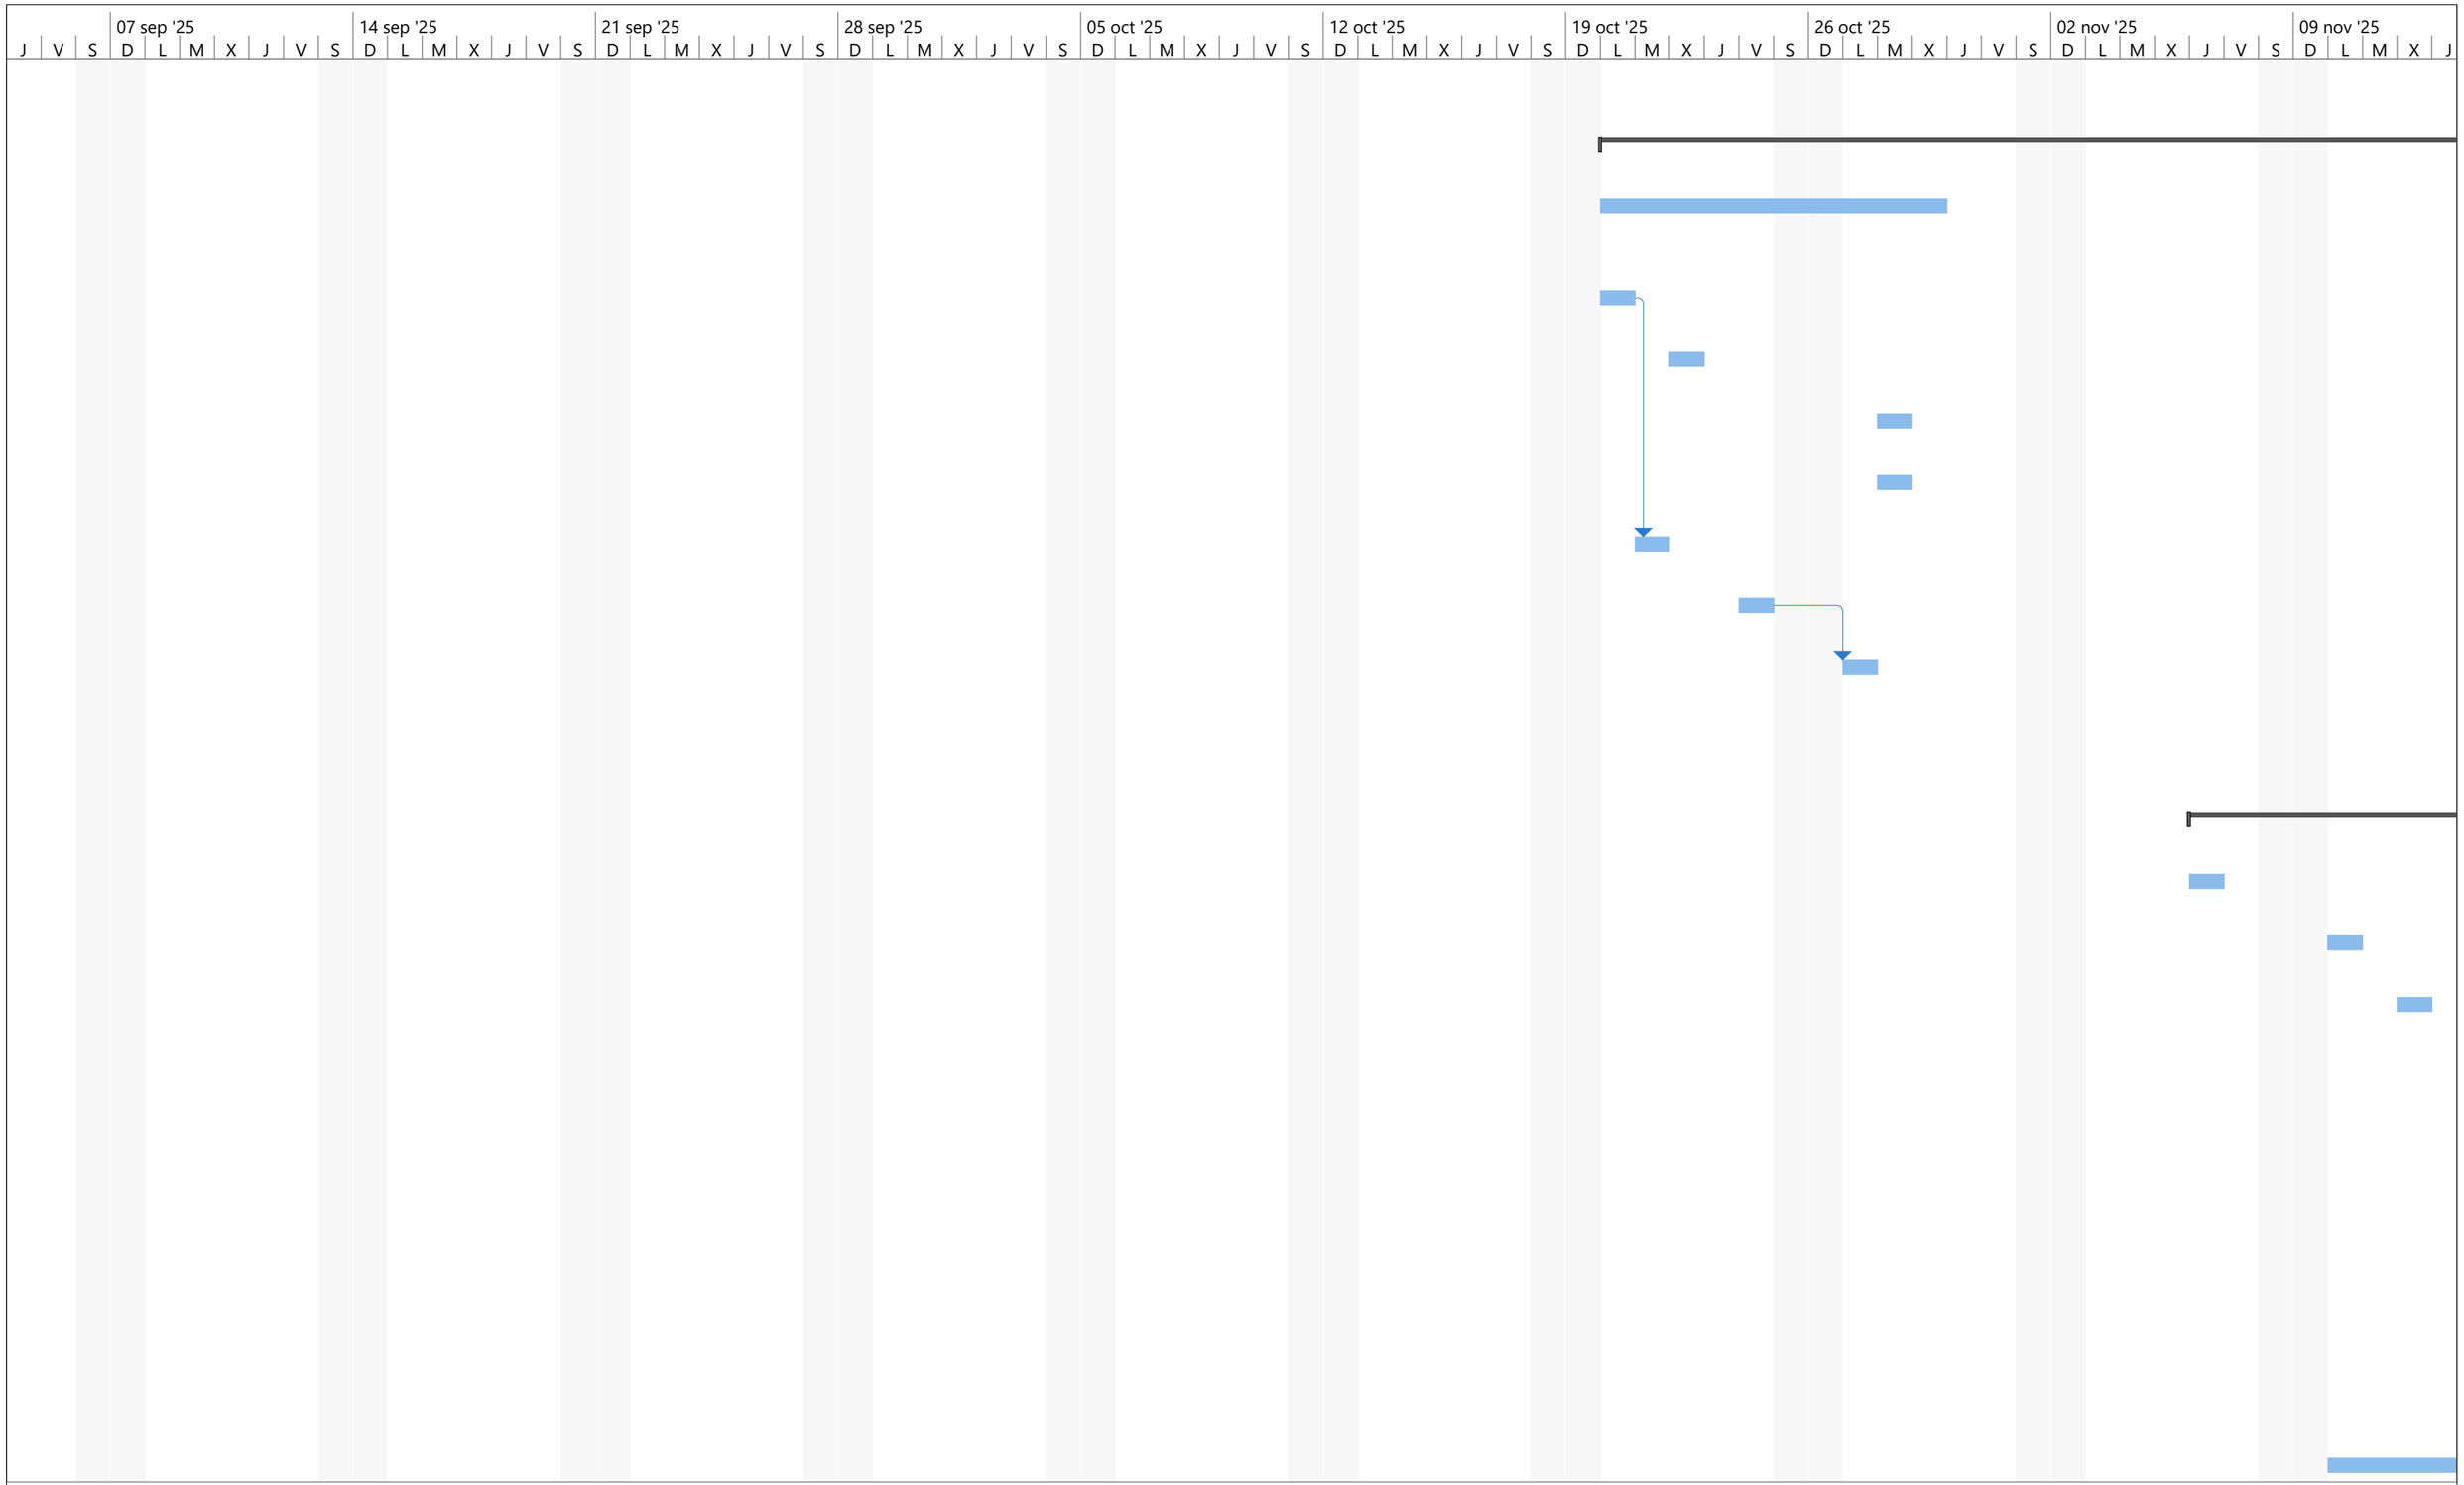

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

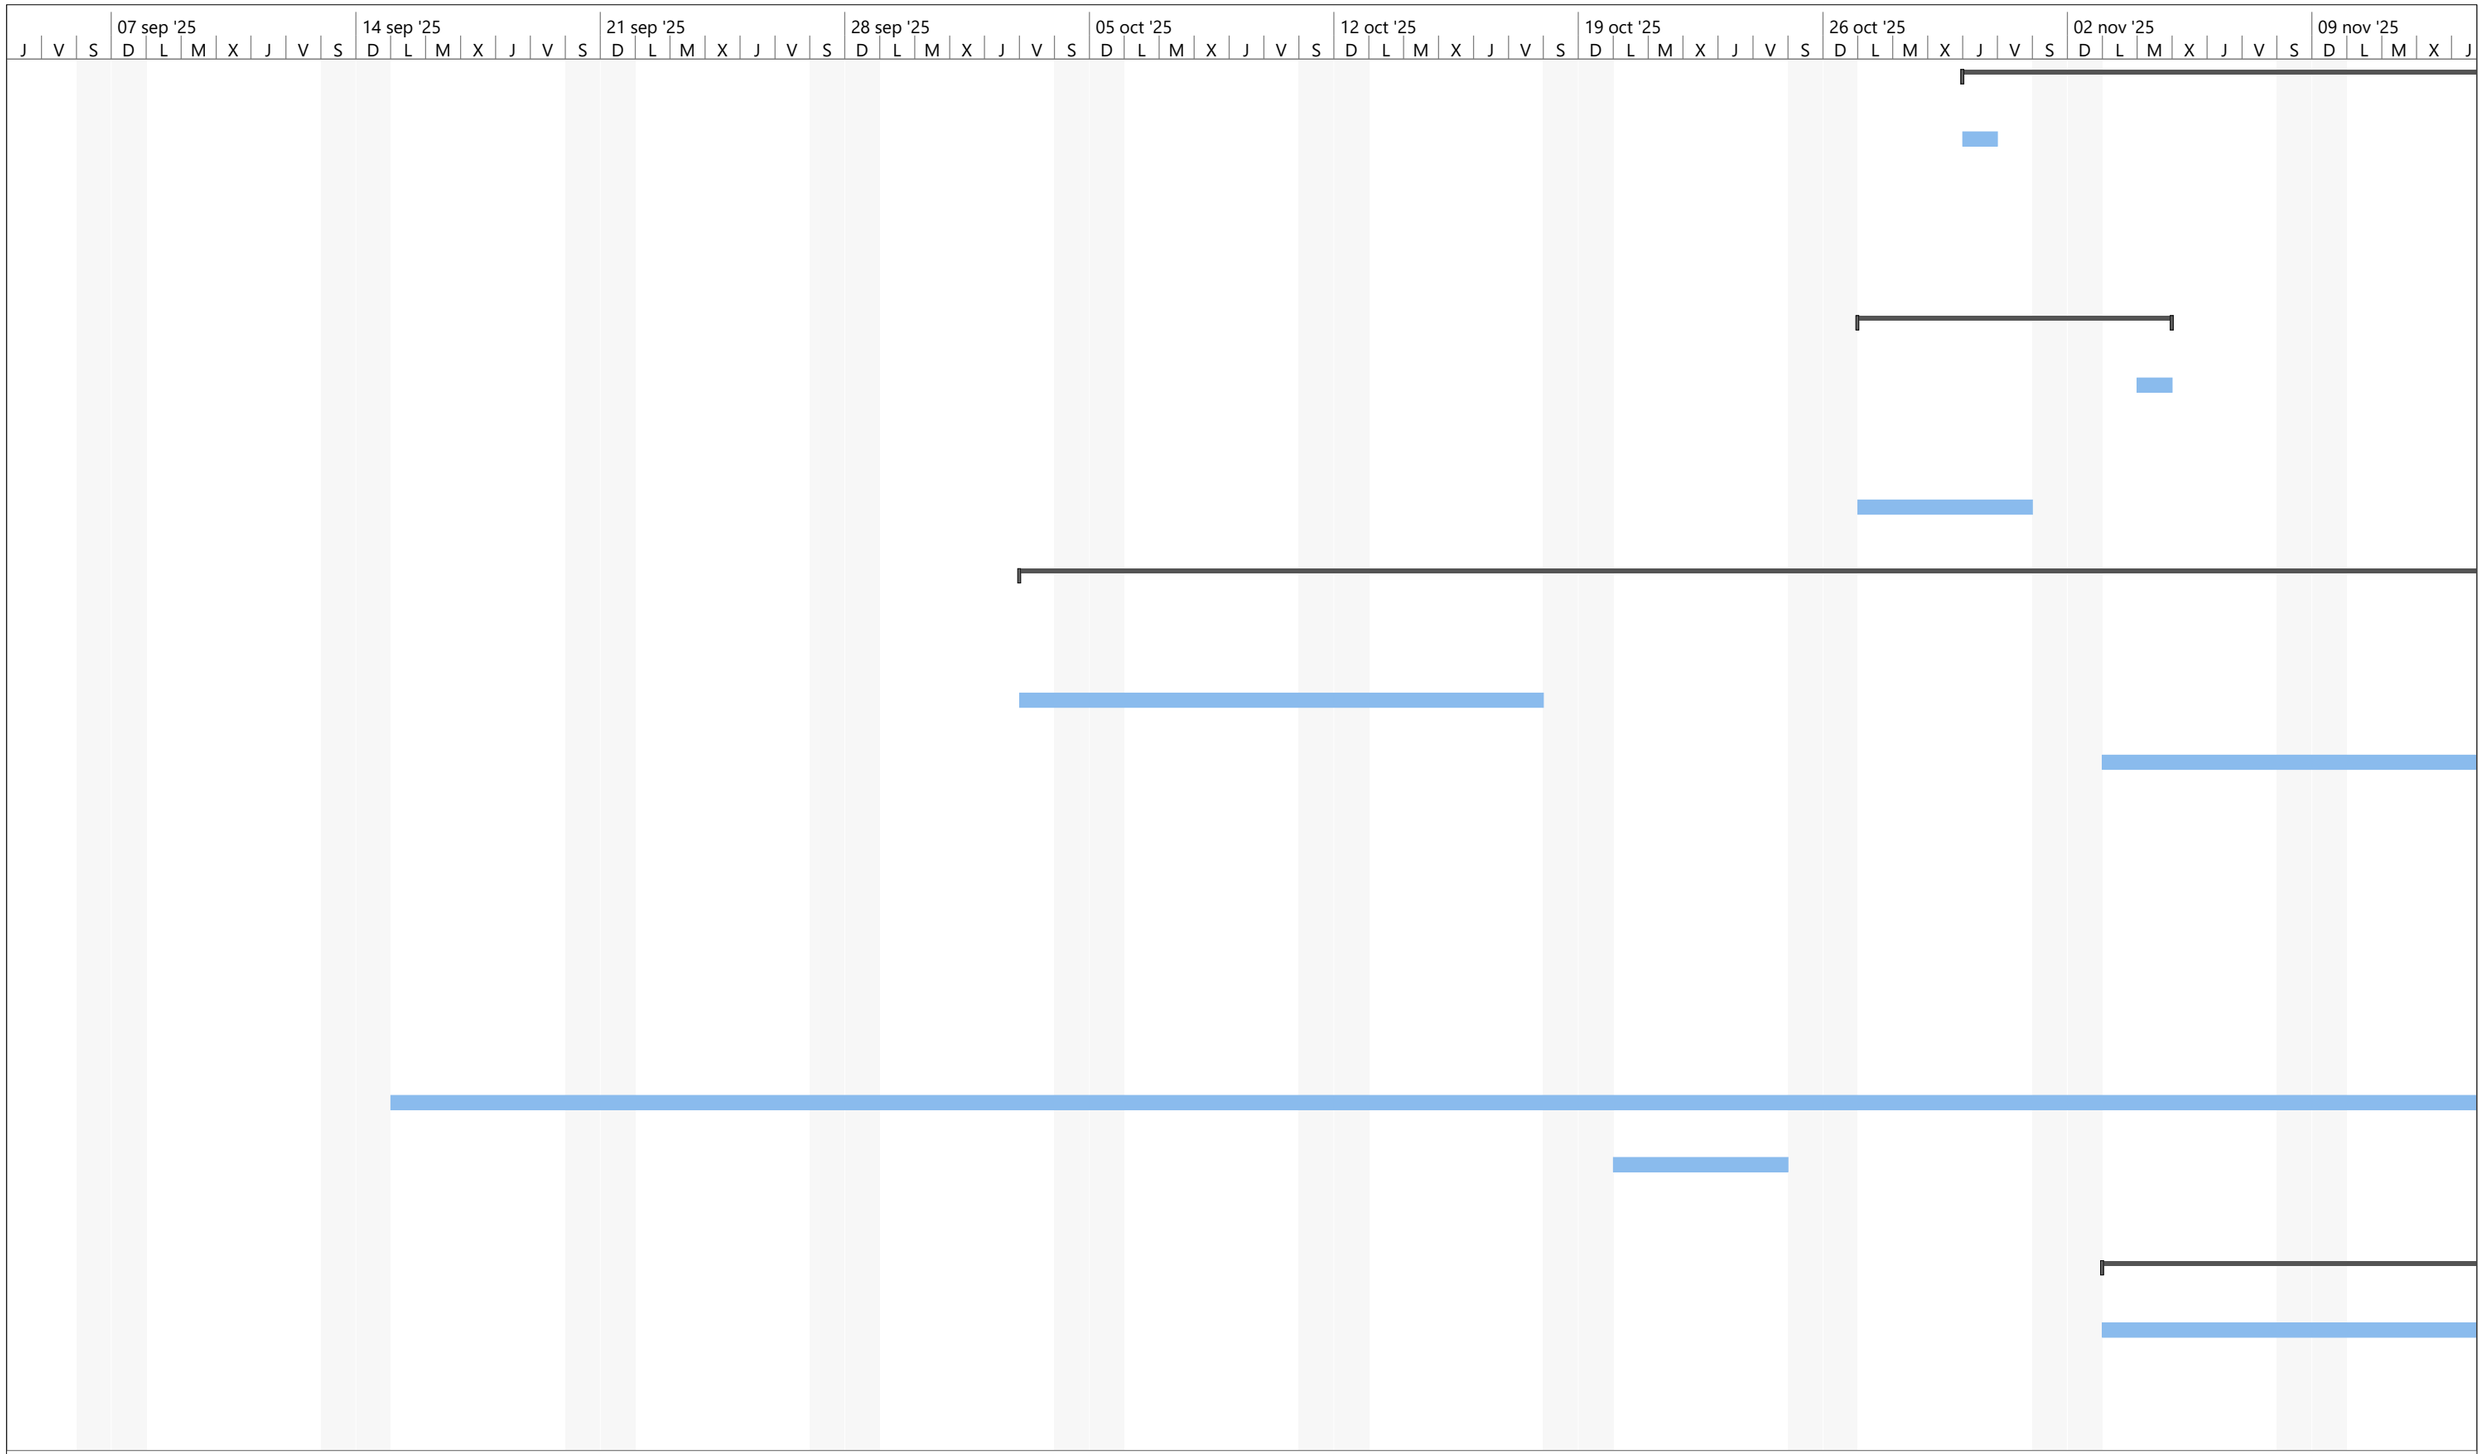

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone


07 sep '25
14 sep '25
21 sep '25
28 sep '25
05 oct '25
12 oct '25
19 oct '25
26 oct '25
02 nov '25
09 nov '25
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

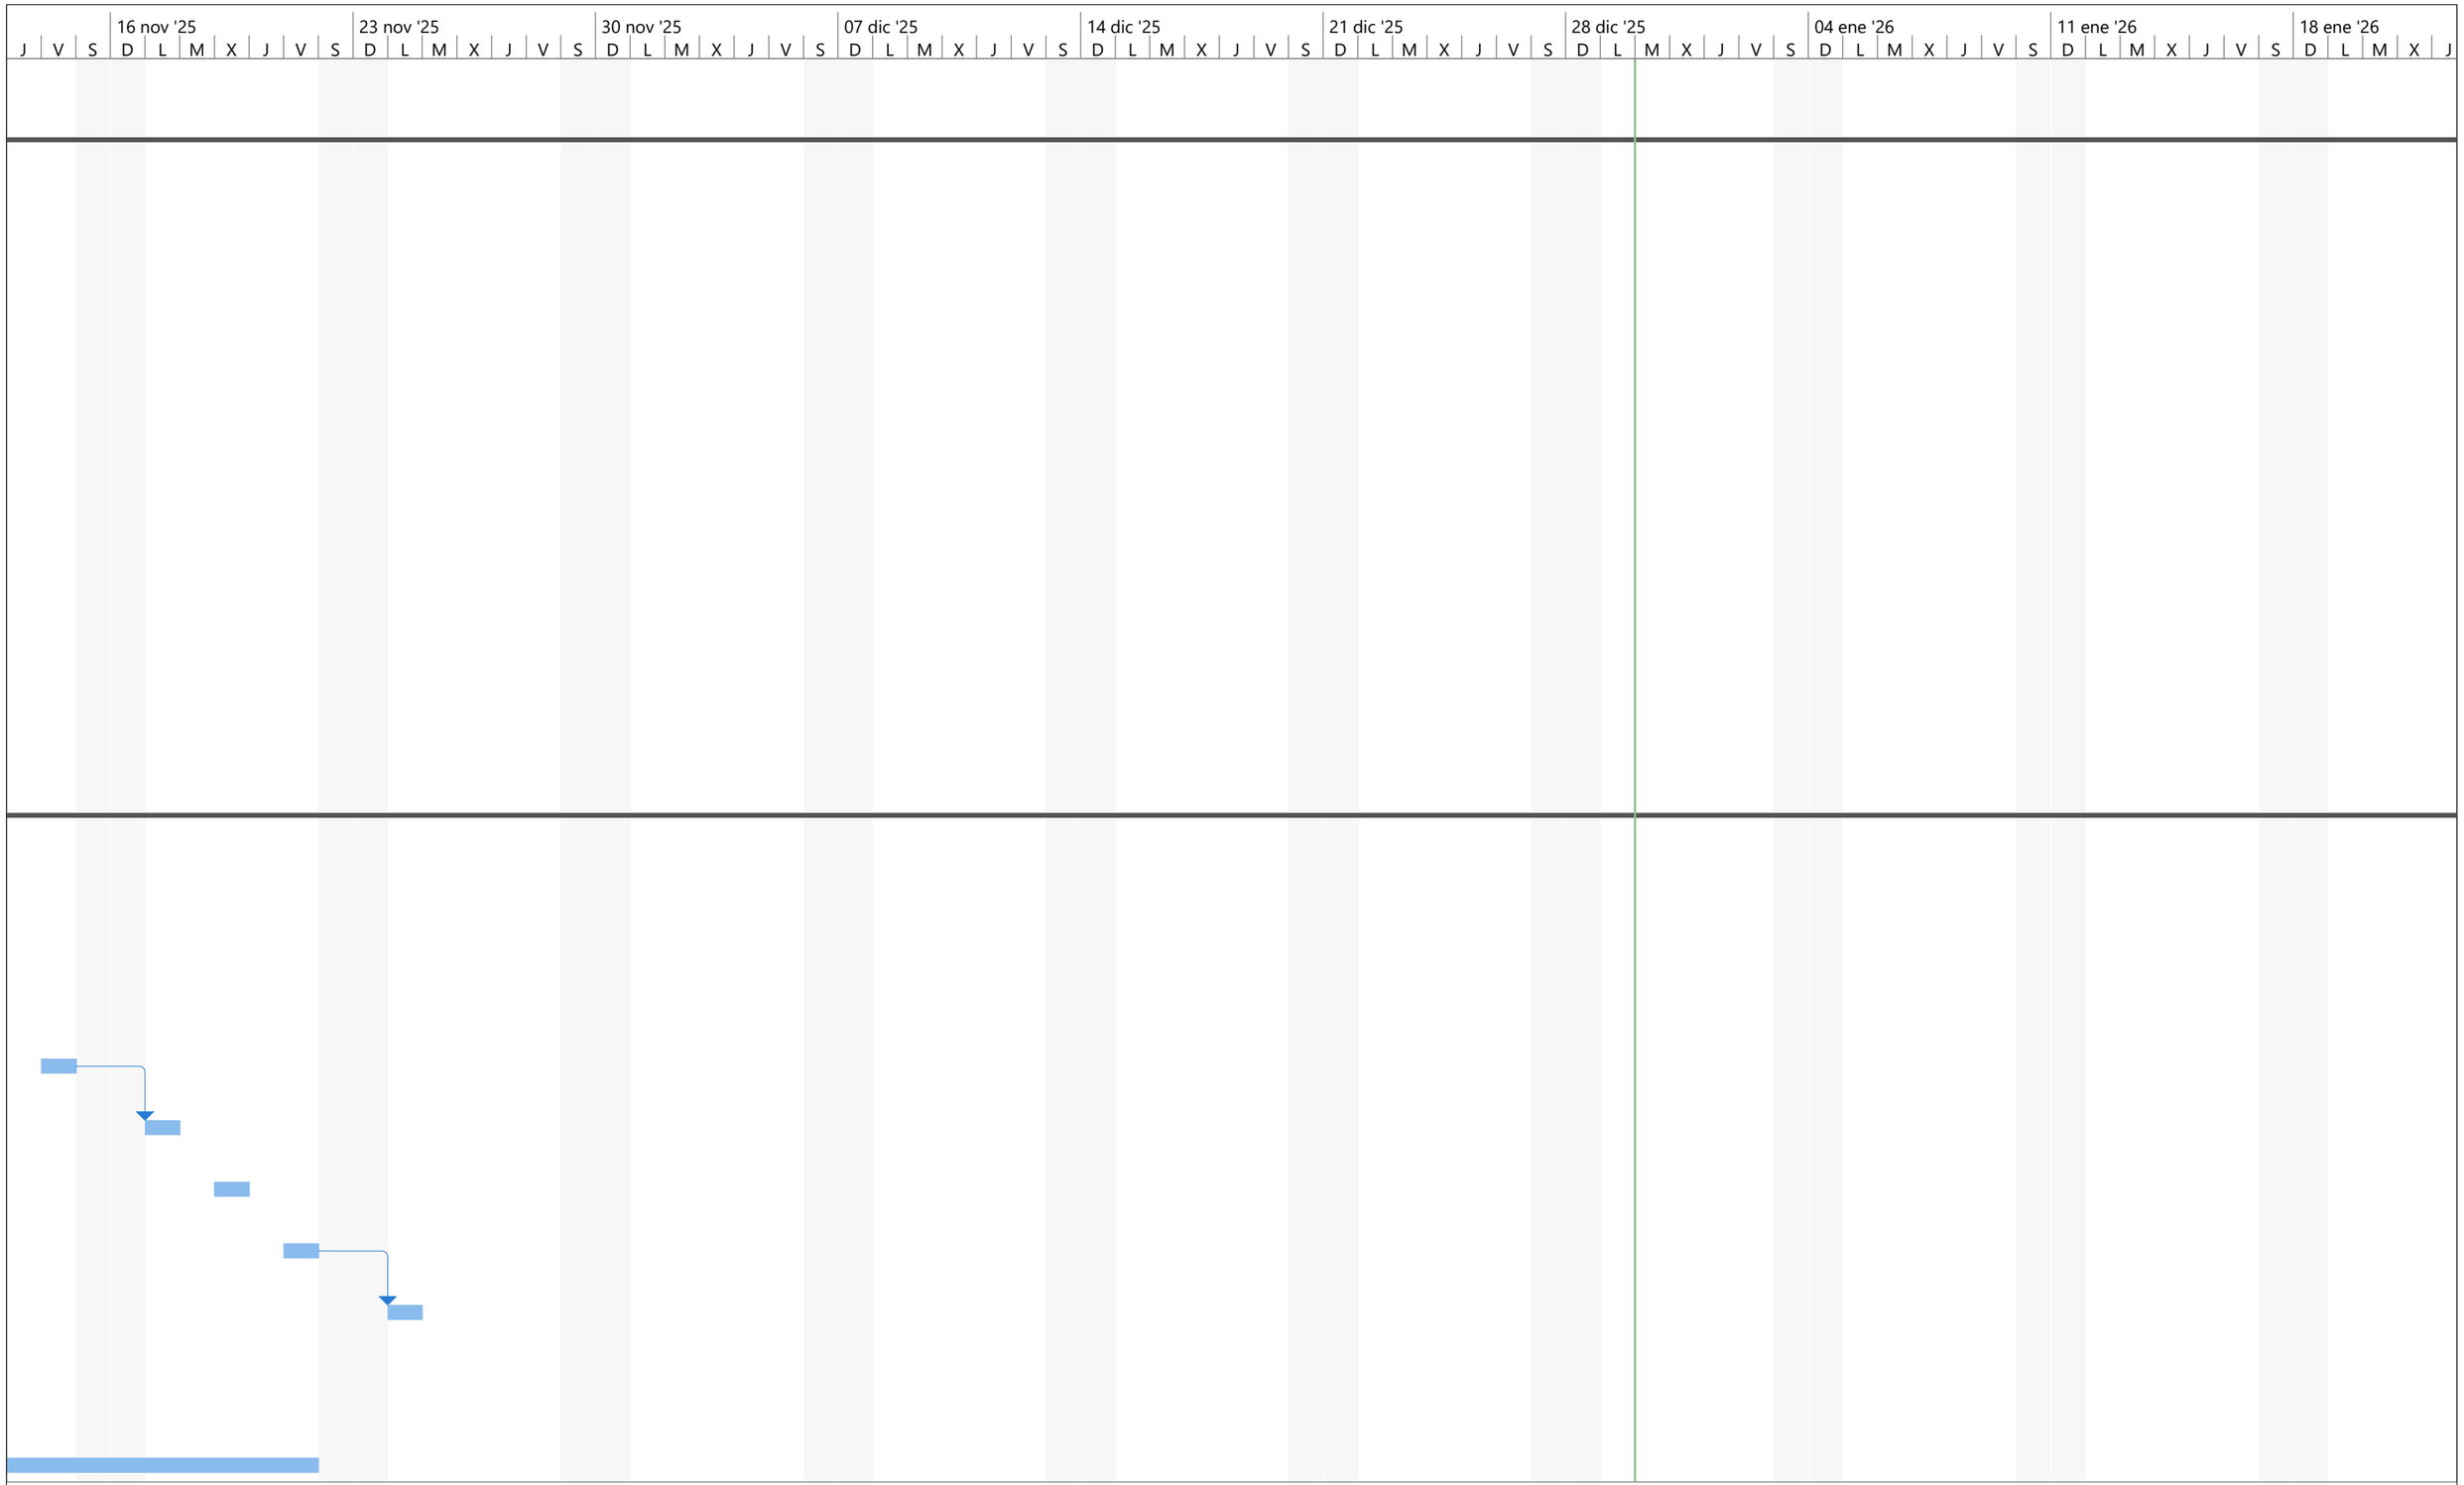


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

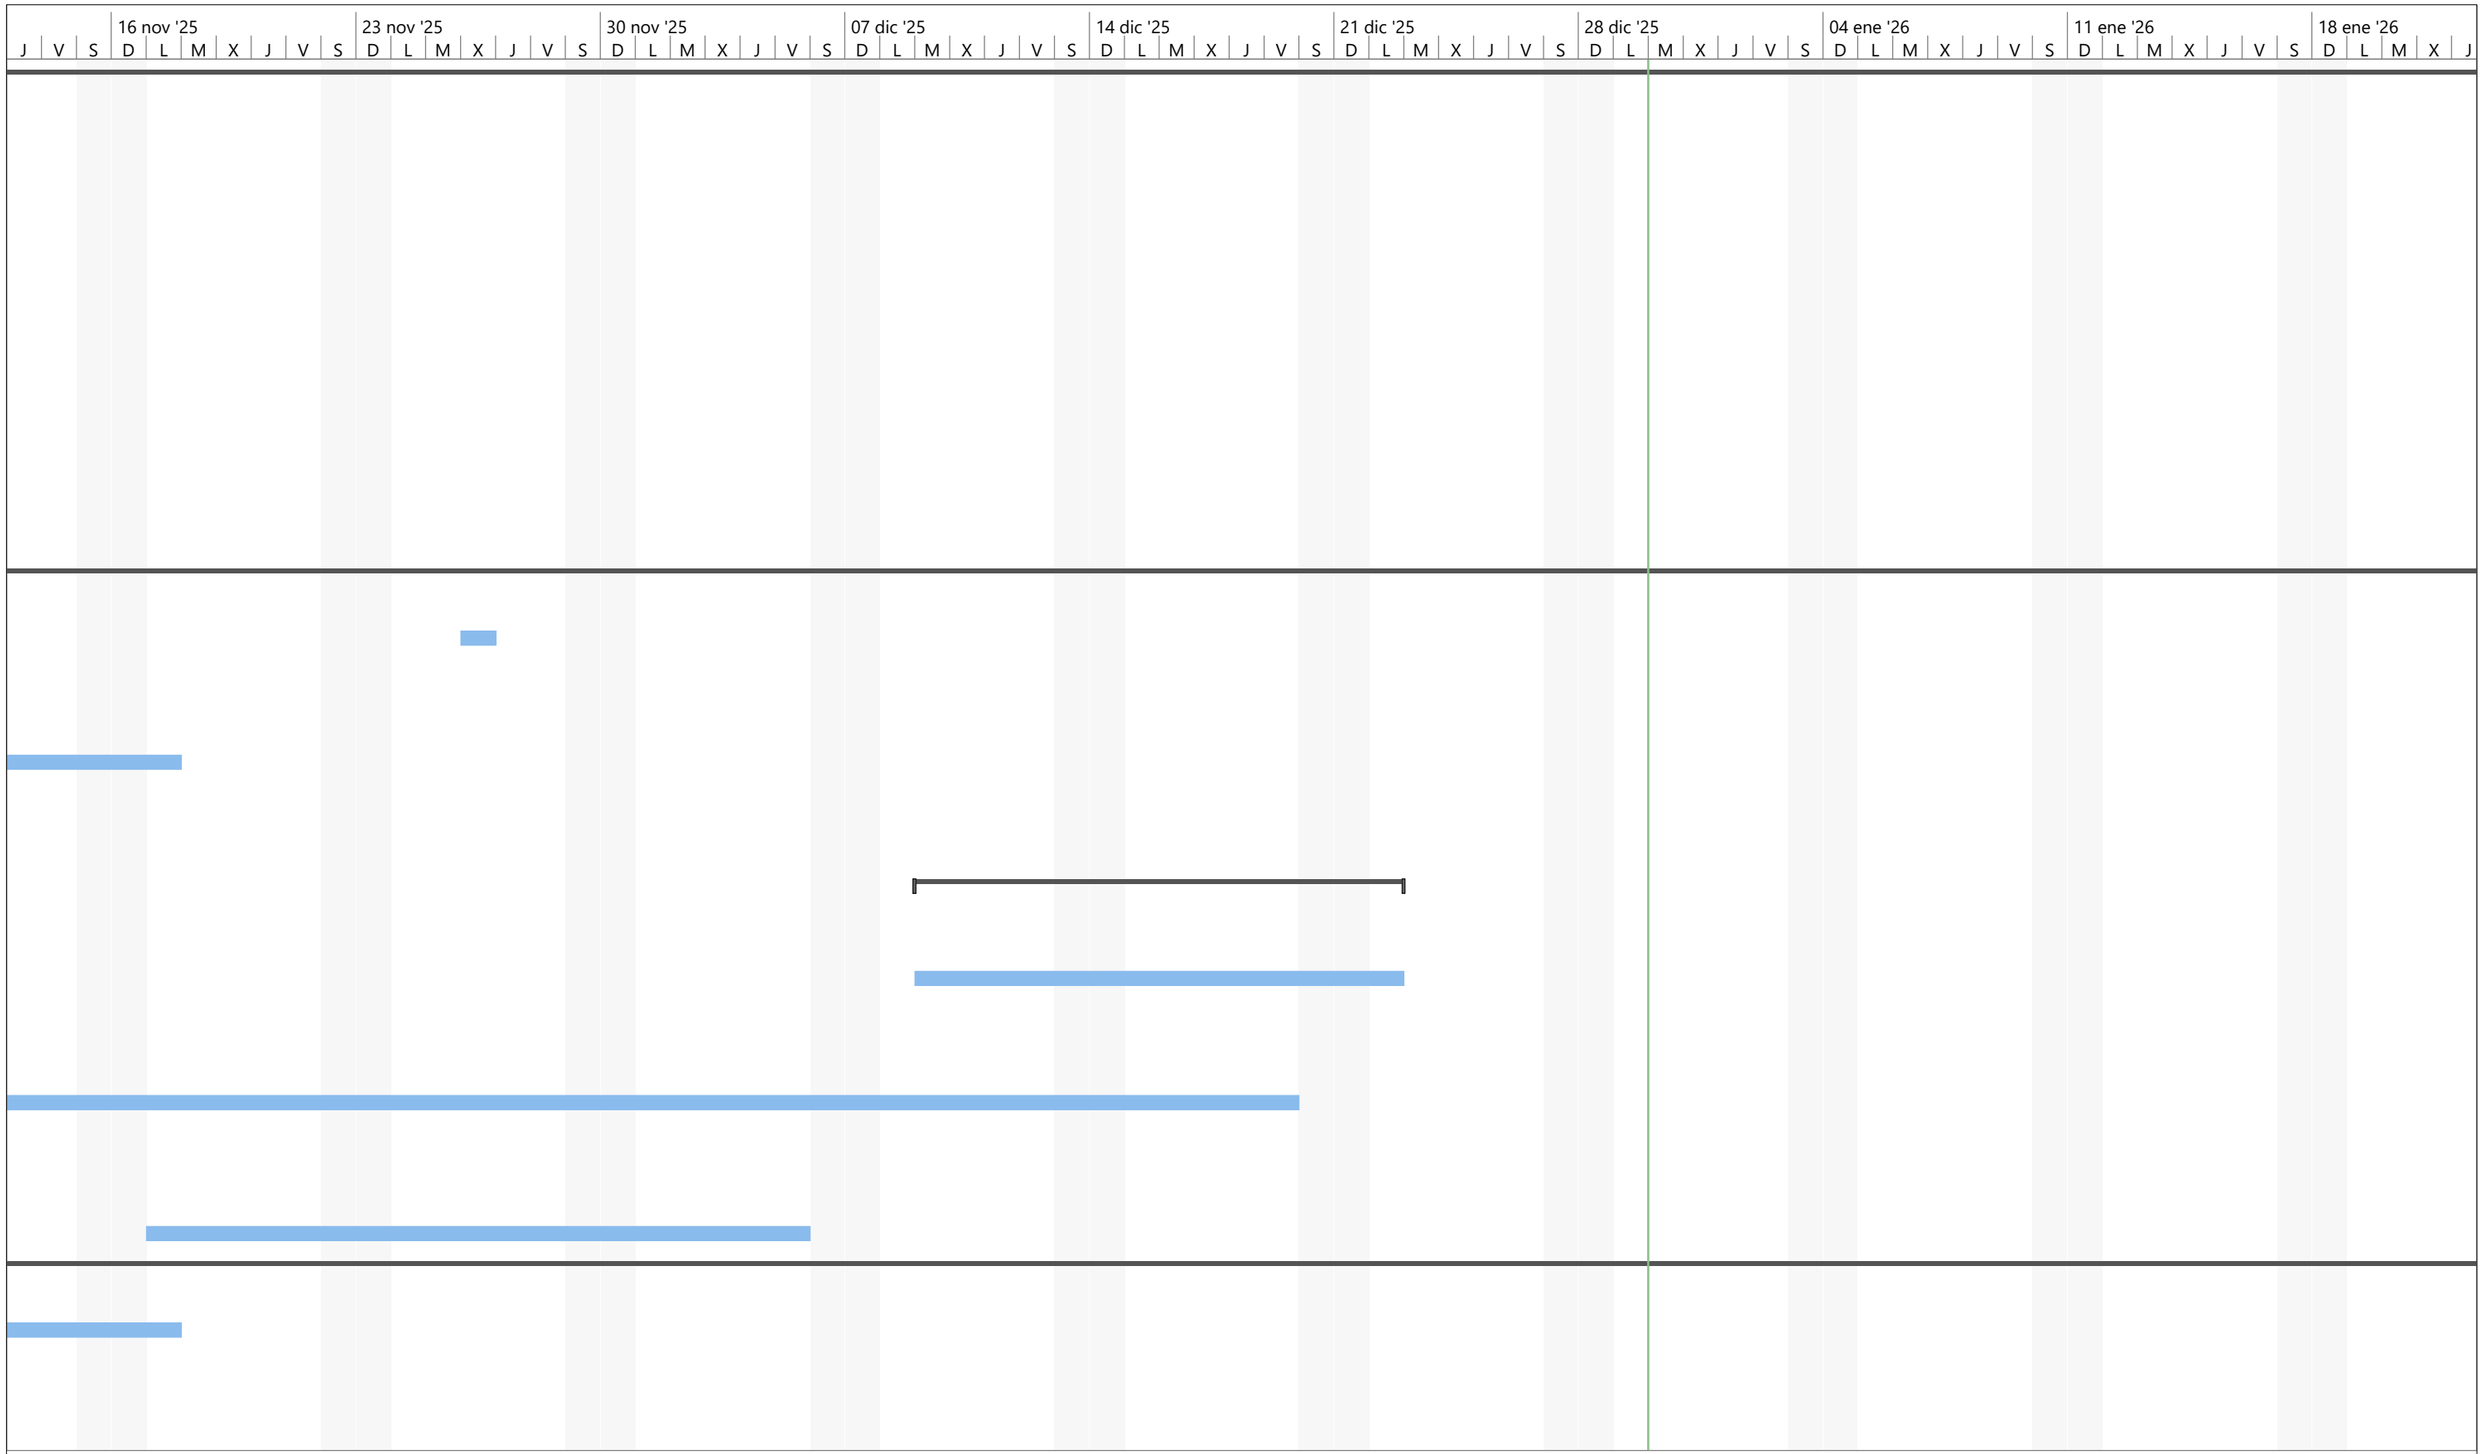


Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

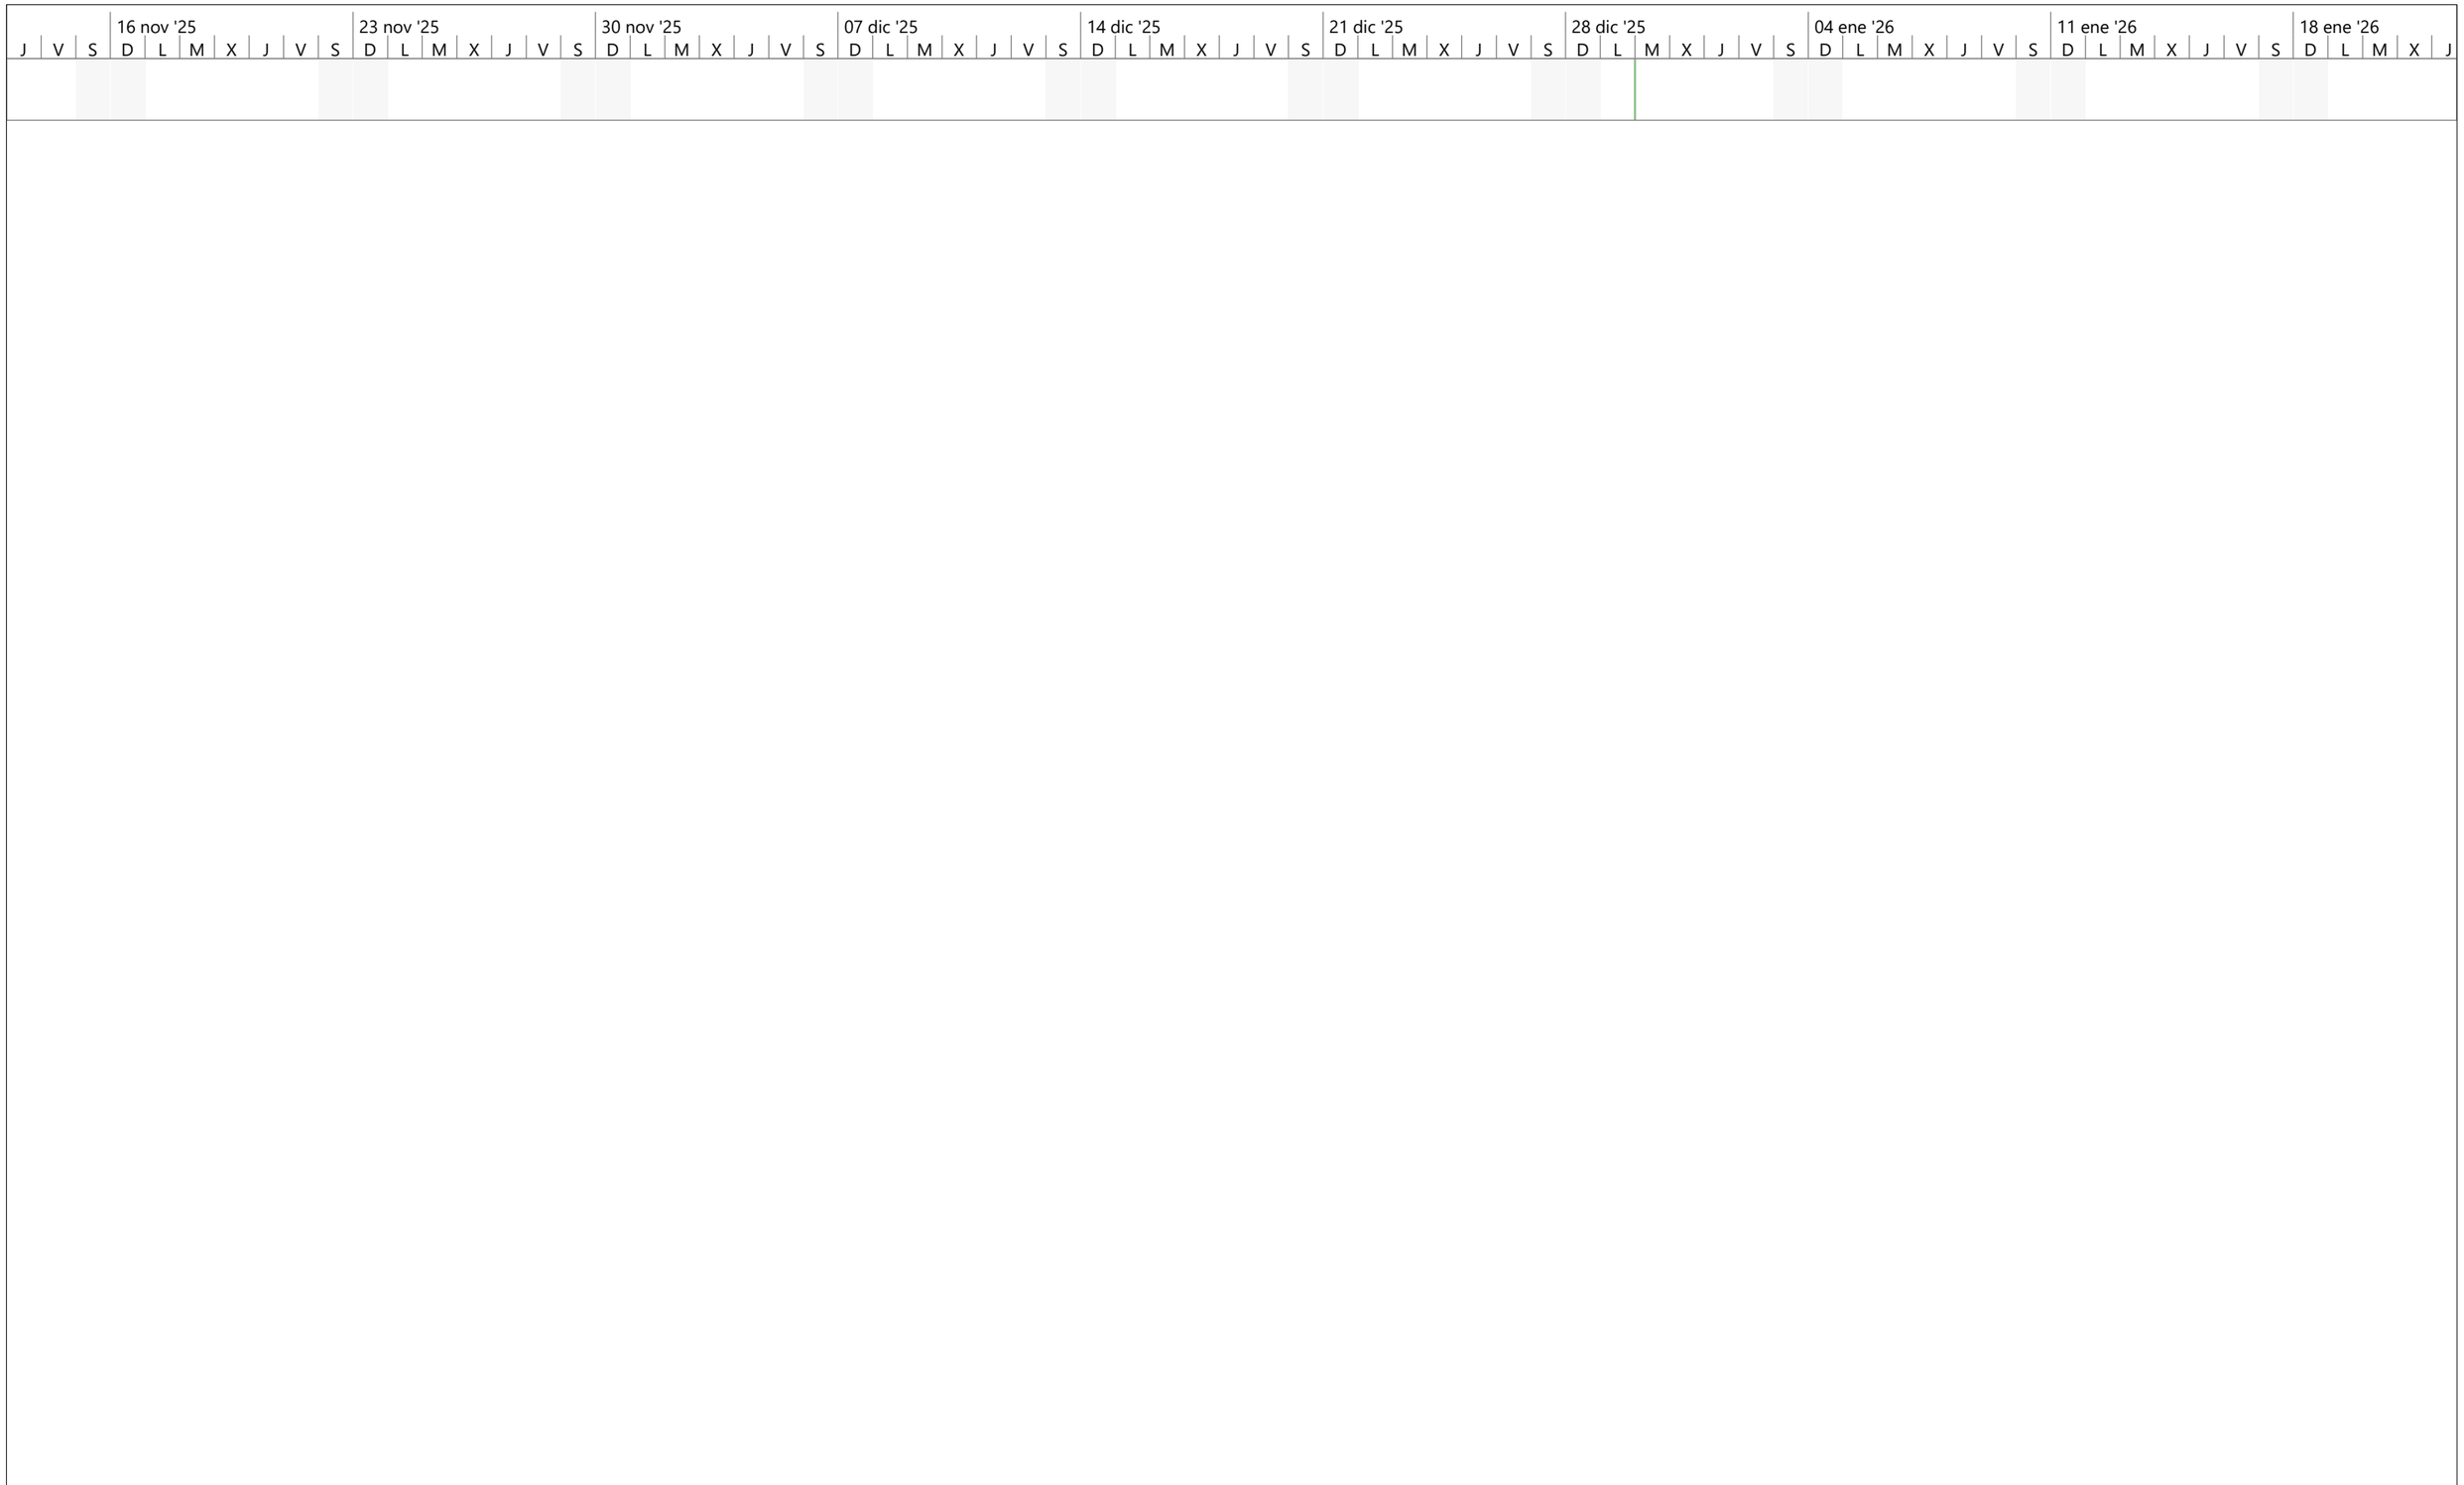

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25


Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone

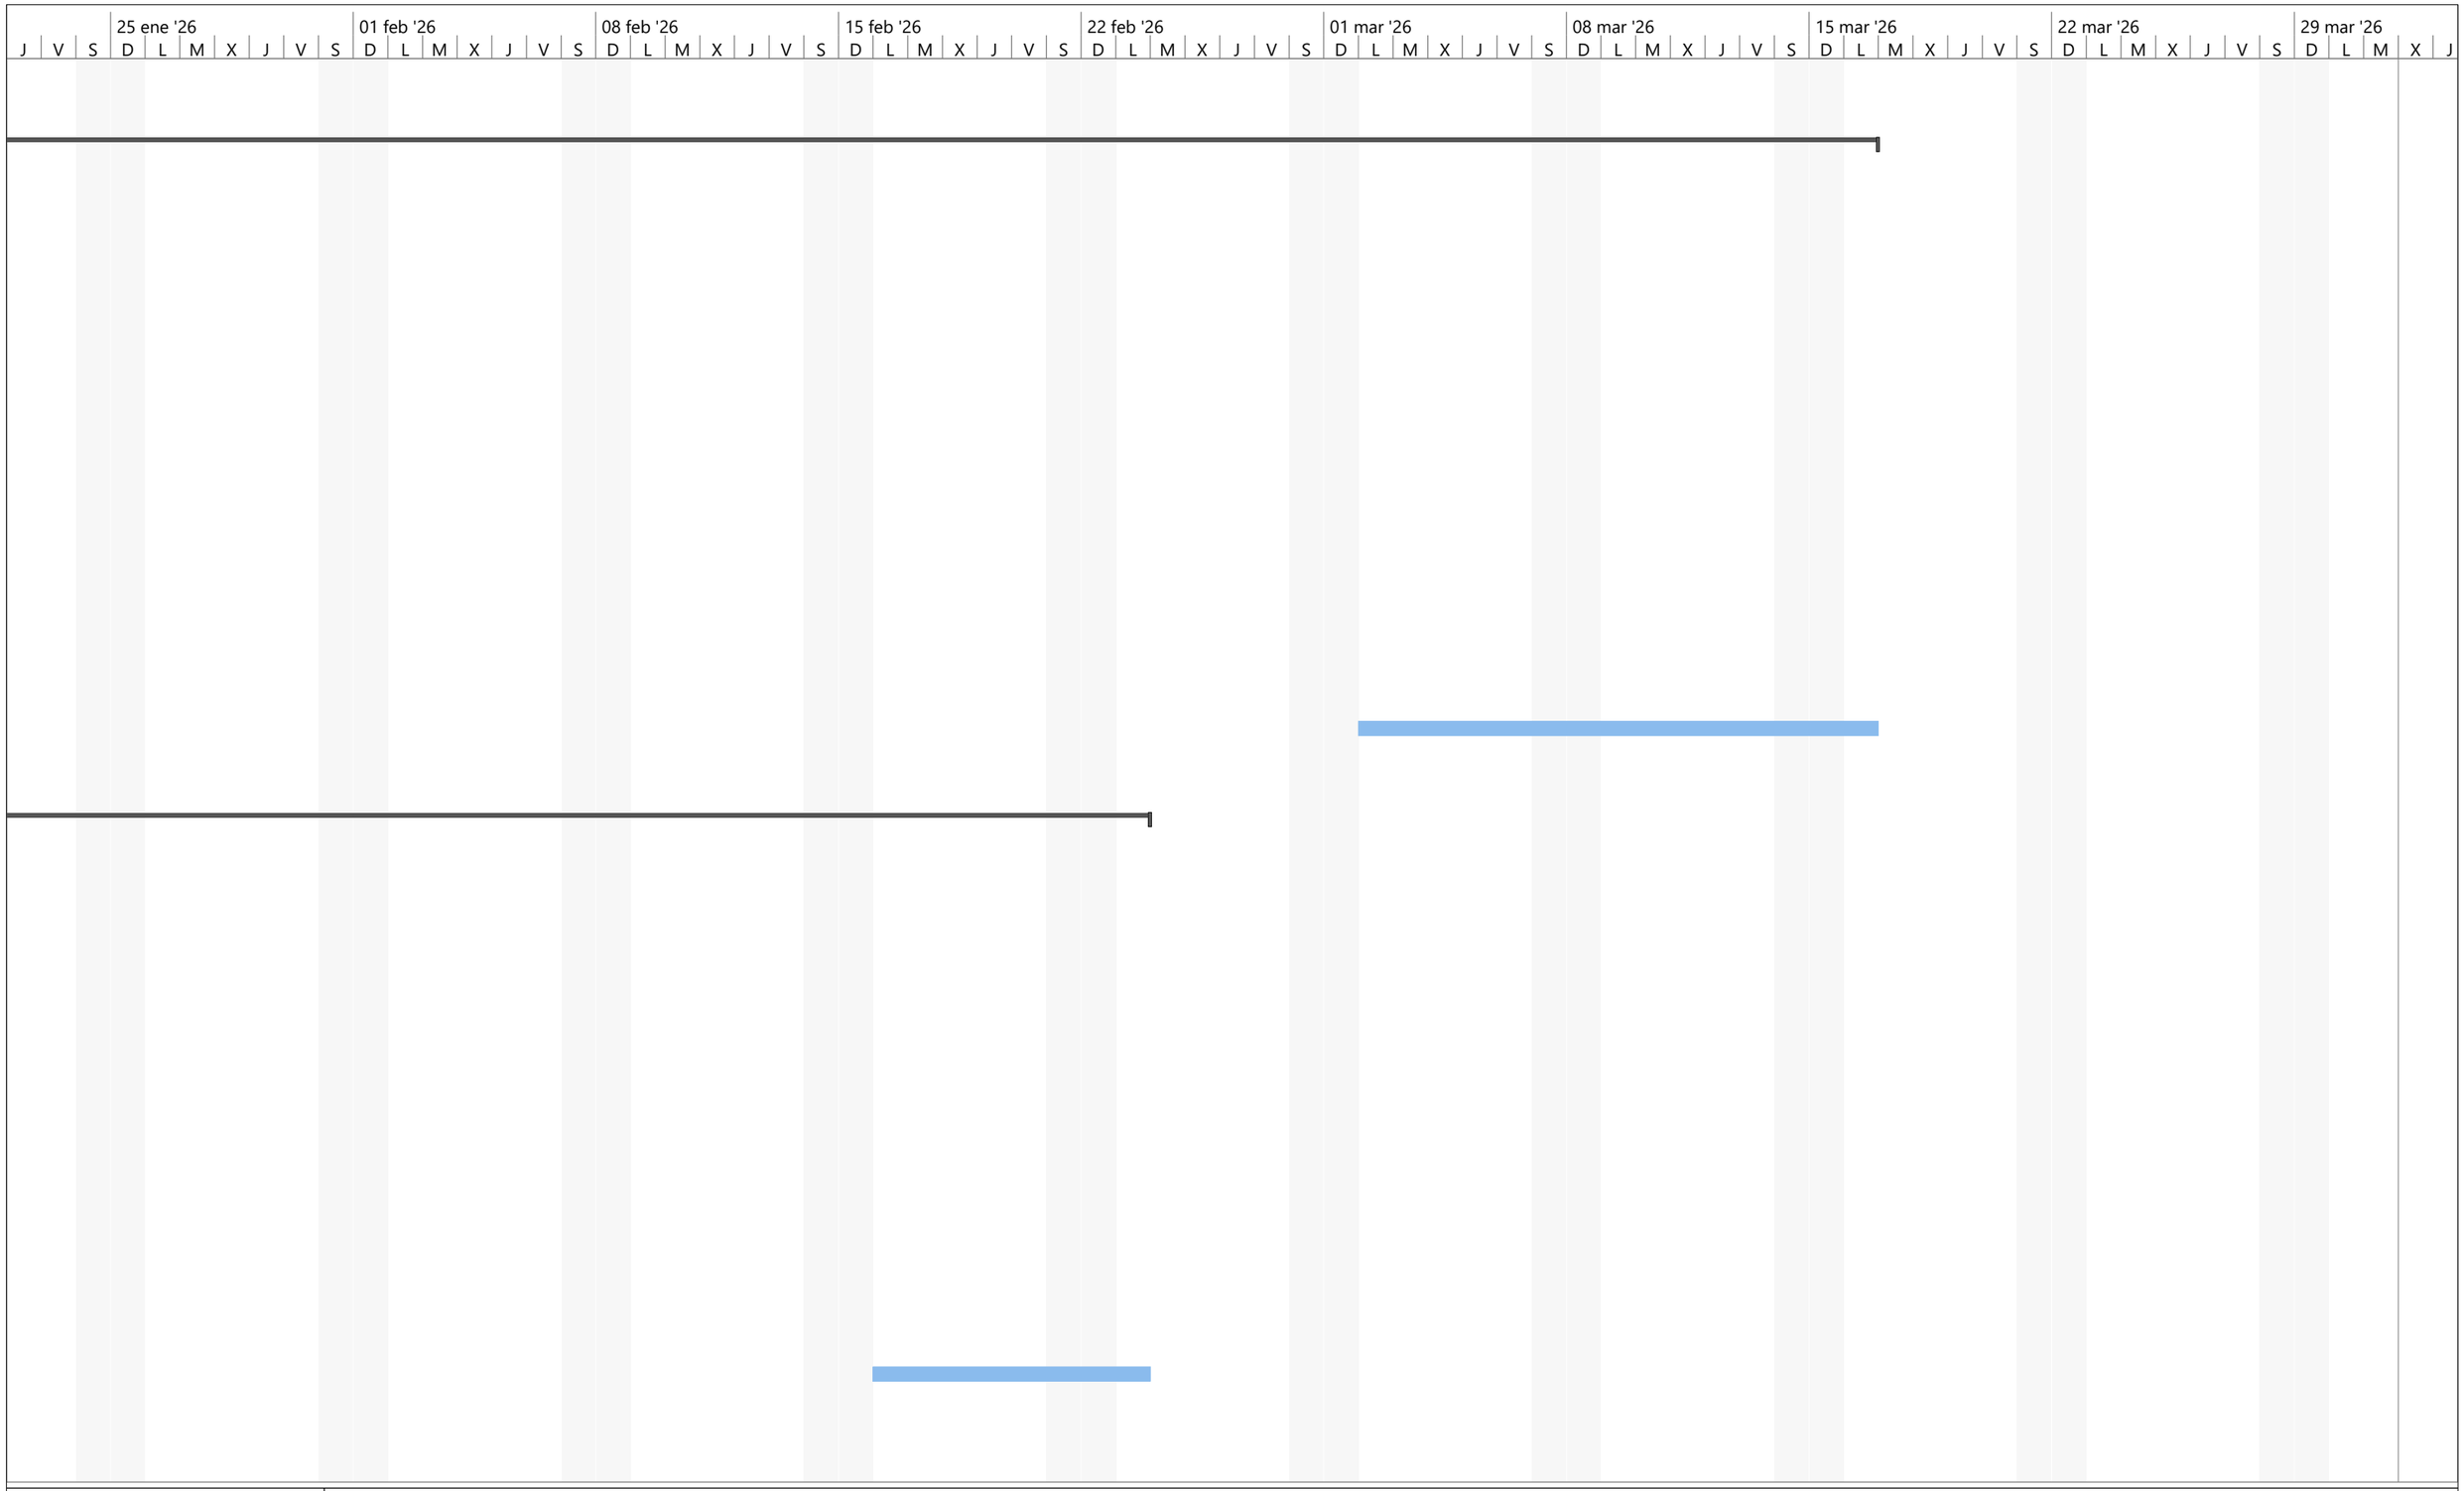
25 ene '26
01 feb '26
08 feb '26
15 feb '26
22 feb '26
01 mar '26
08 mar '26
15 mar '26
22 mar '26
29 mar '26
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

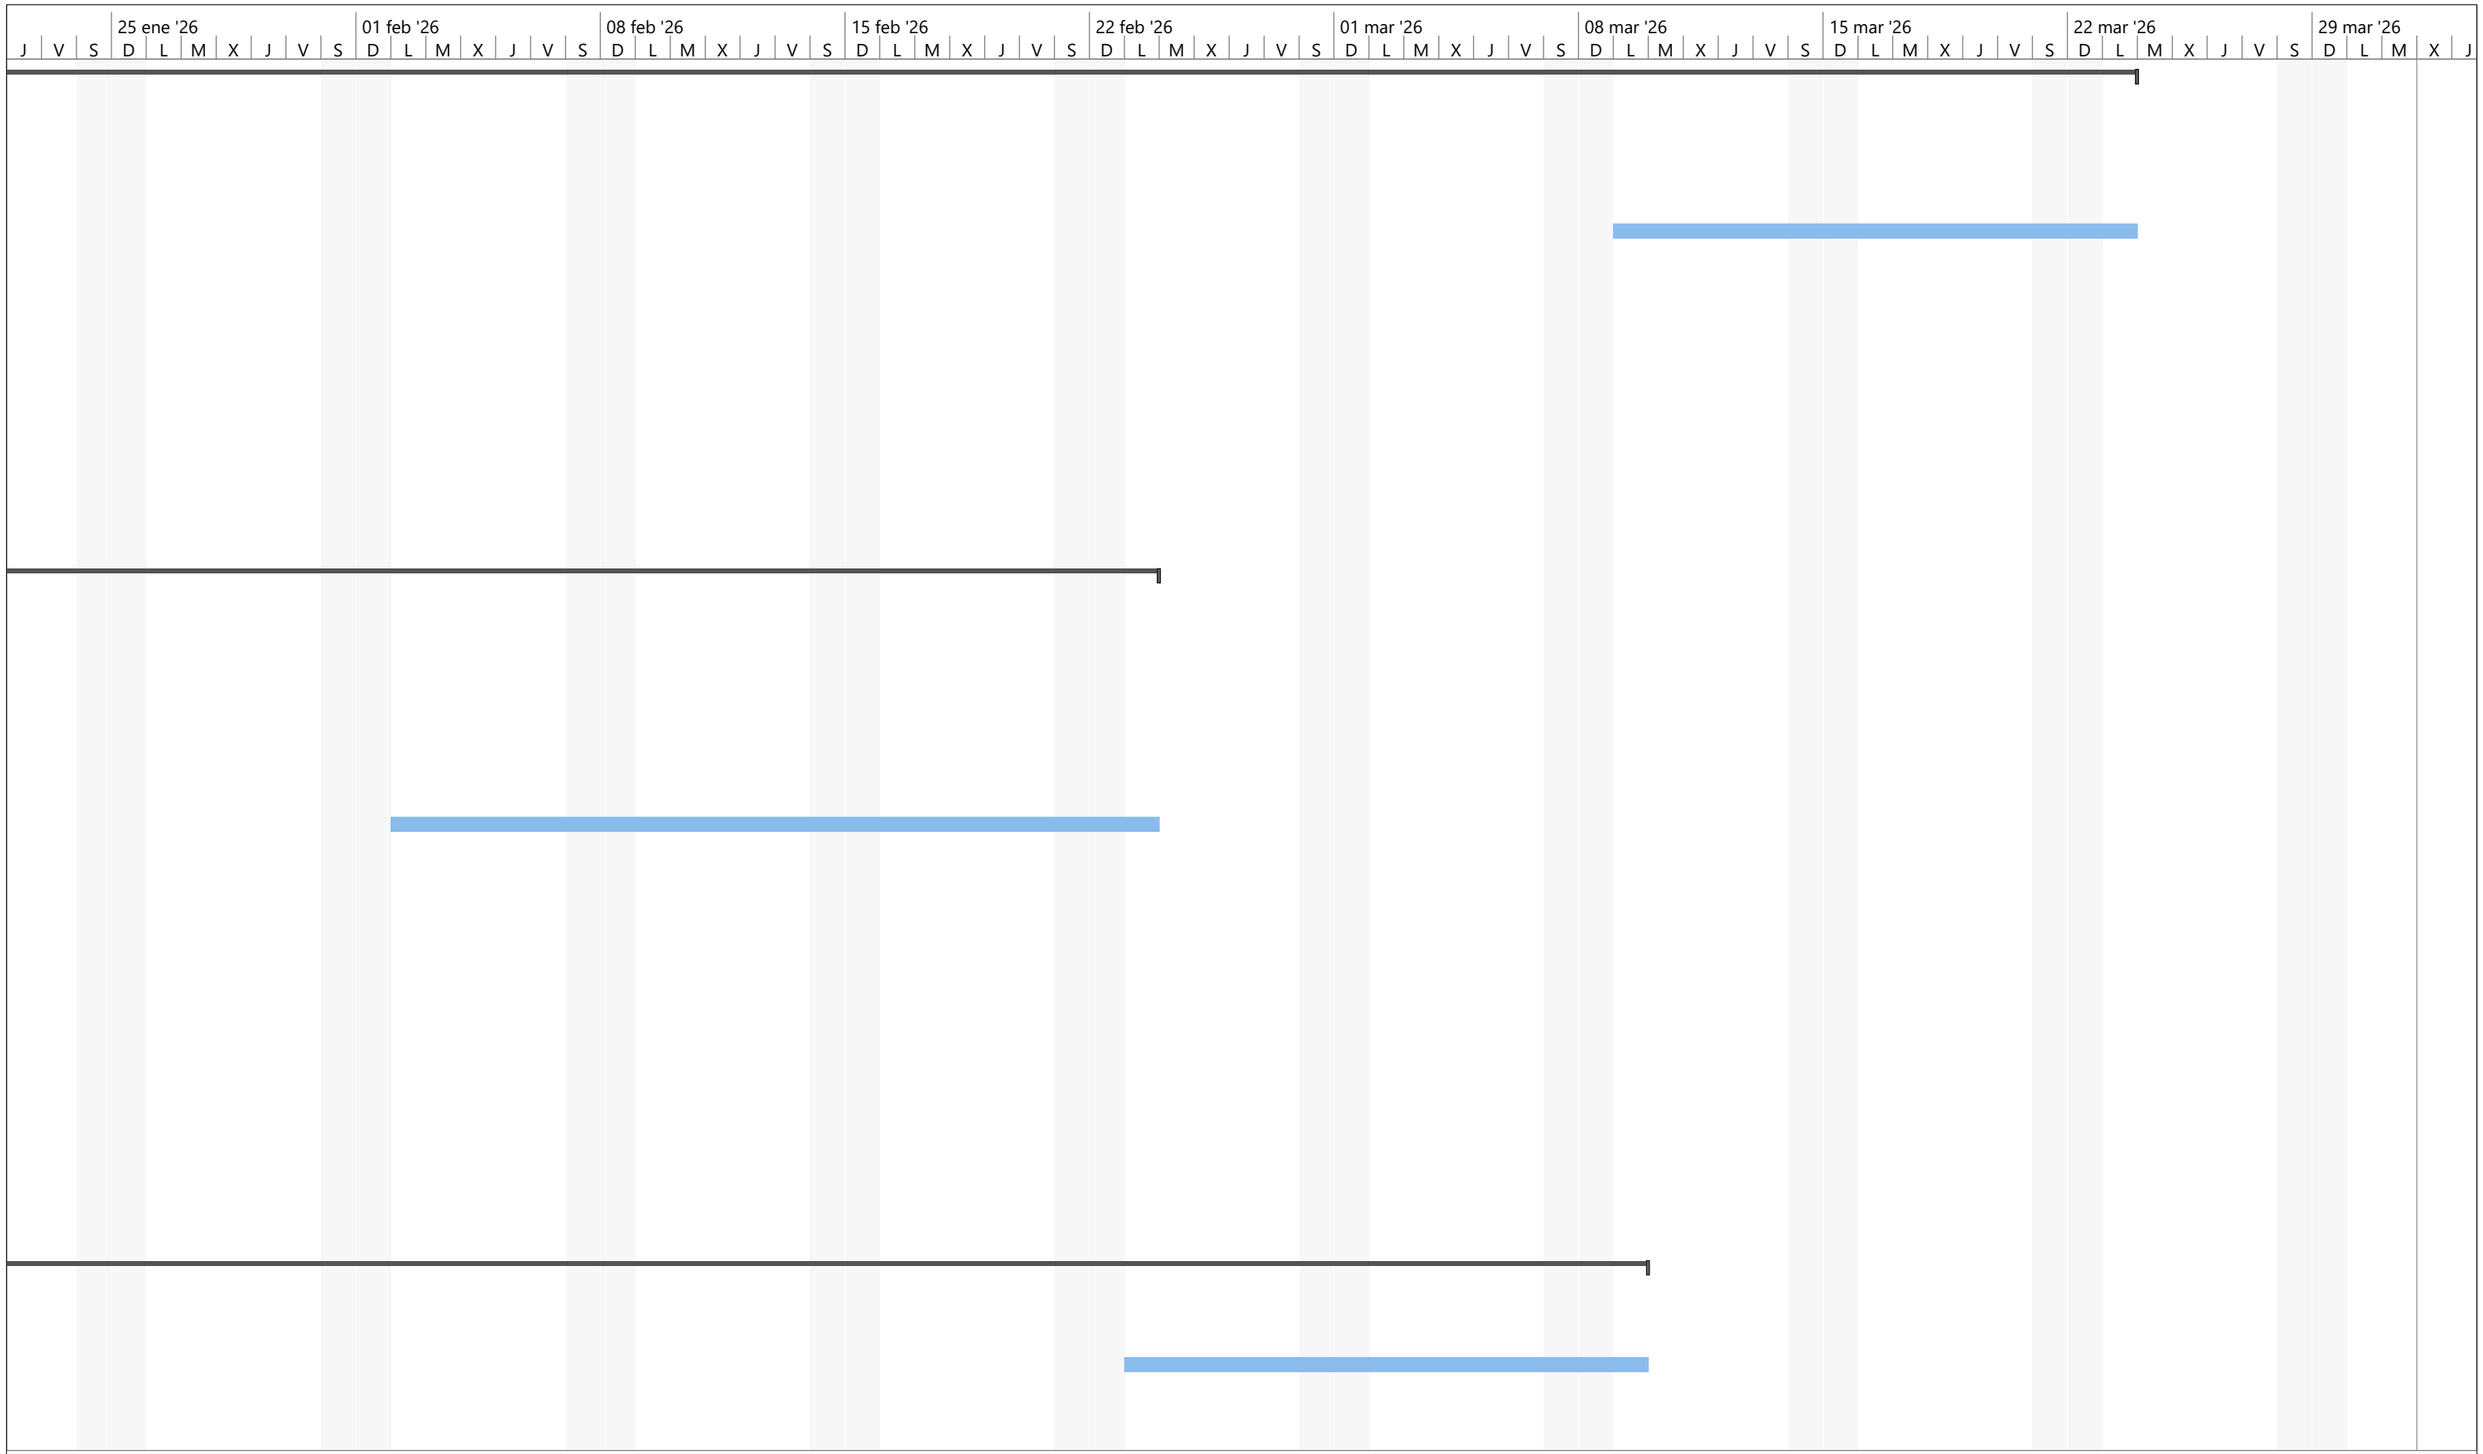

Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone



Project: Project1 PLan de trabaj
Date: mar 30/12/25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	
